


Vorbereidend asfaltwerk 14 en 15 april

Vrijdag 14-4

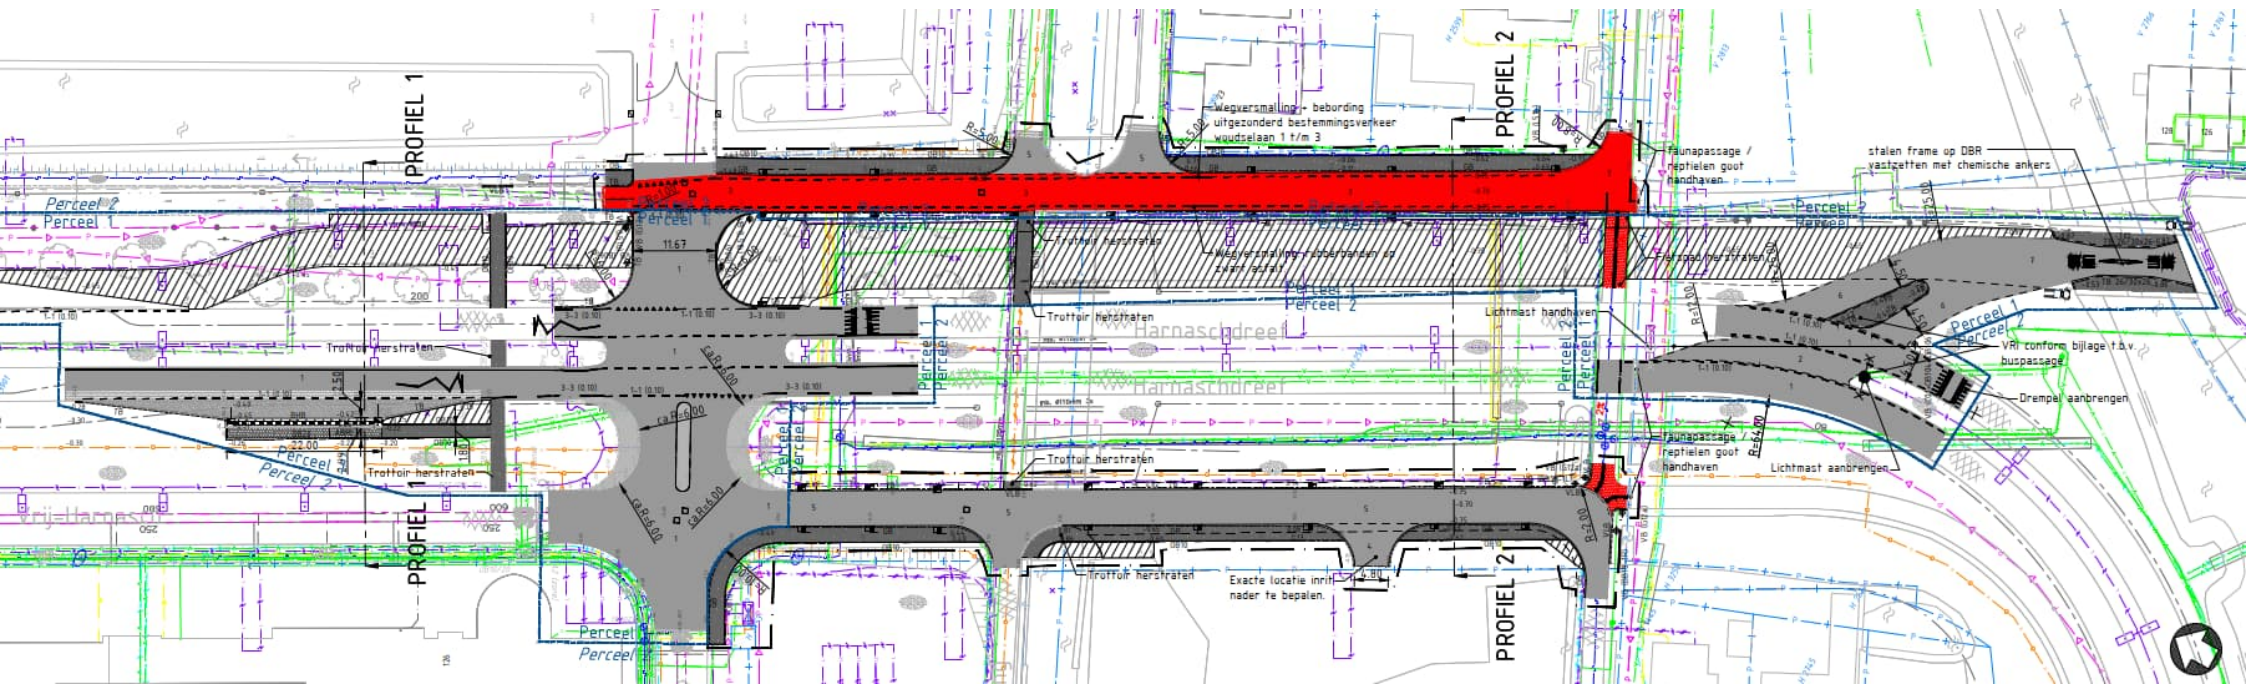


Vrijdag 14-4


7:00 – 11:00

Frezen + reinigen deklaag


1,50 m1 frees + veegauto

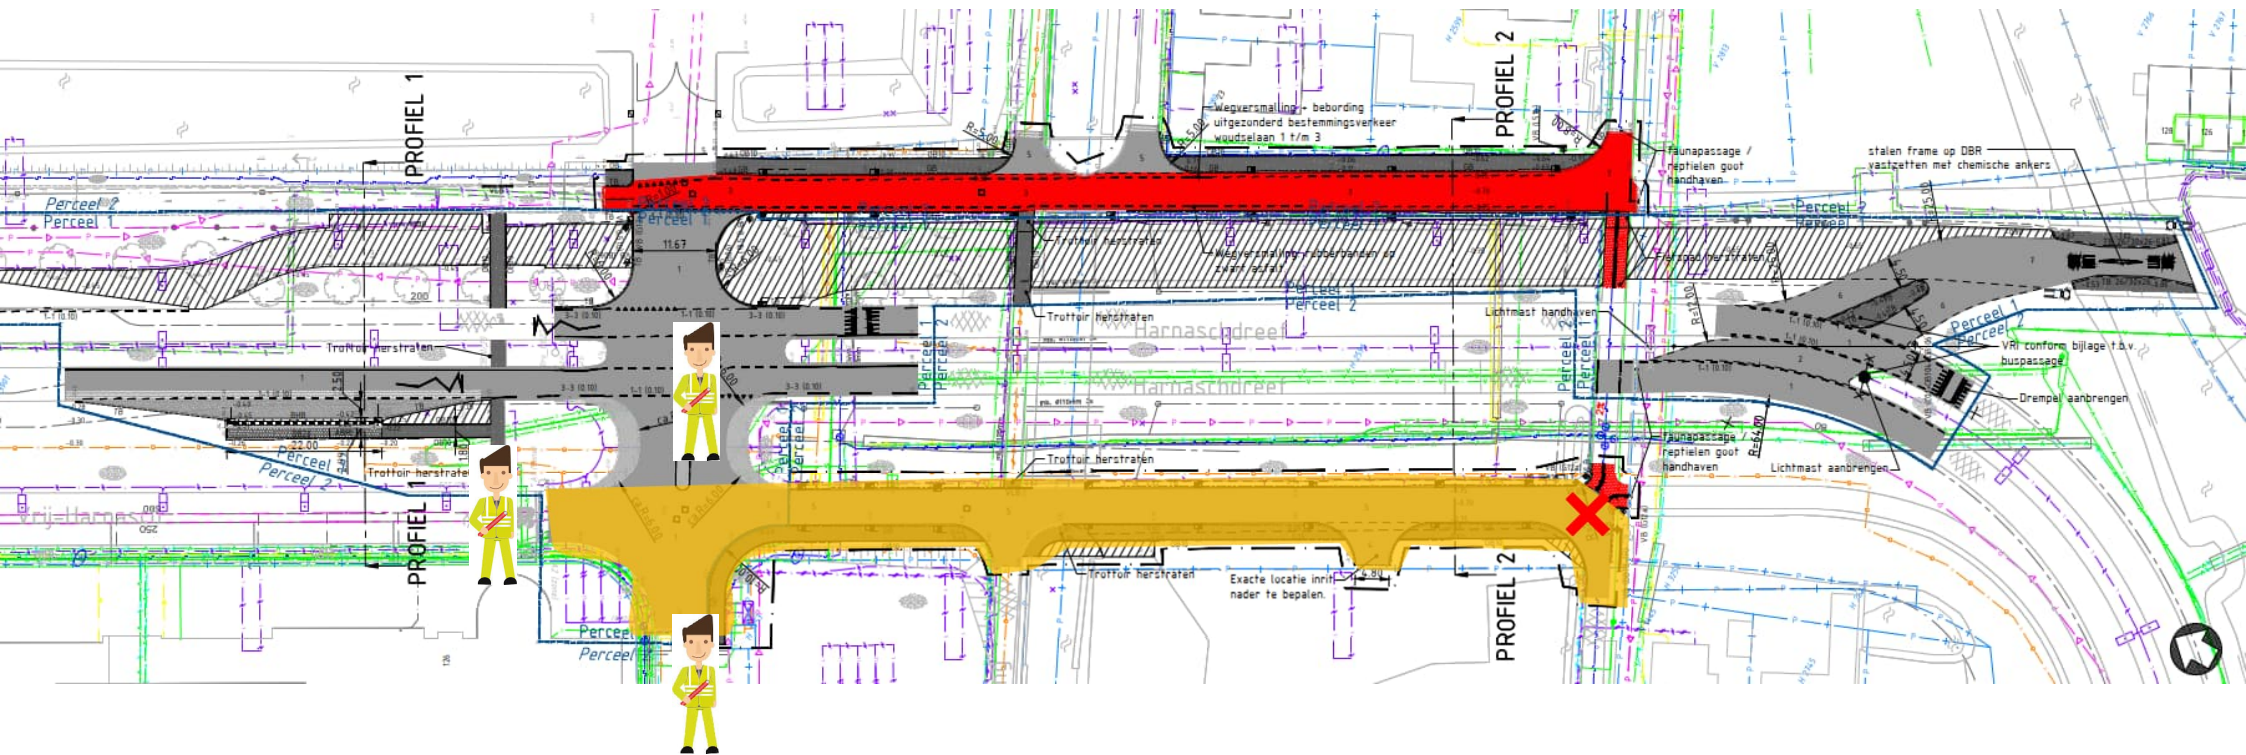


Vrijdag 14-4
11:00 – 13:00
Frezen aanzetten
50 cm frees

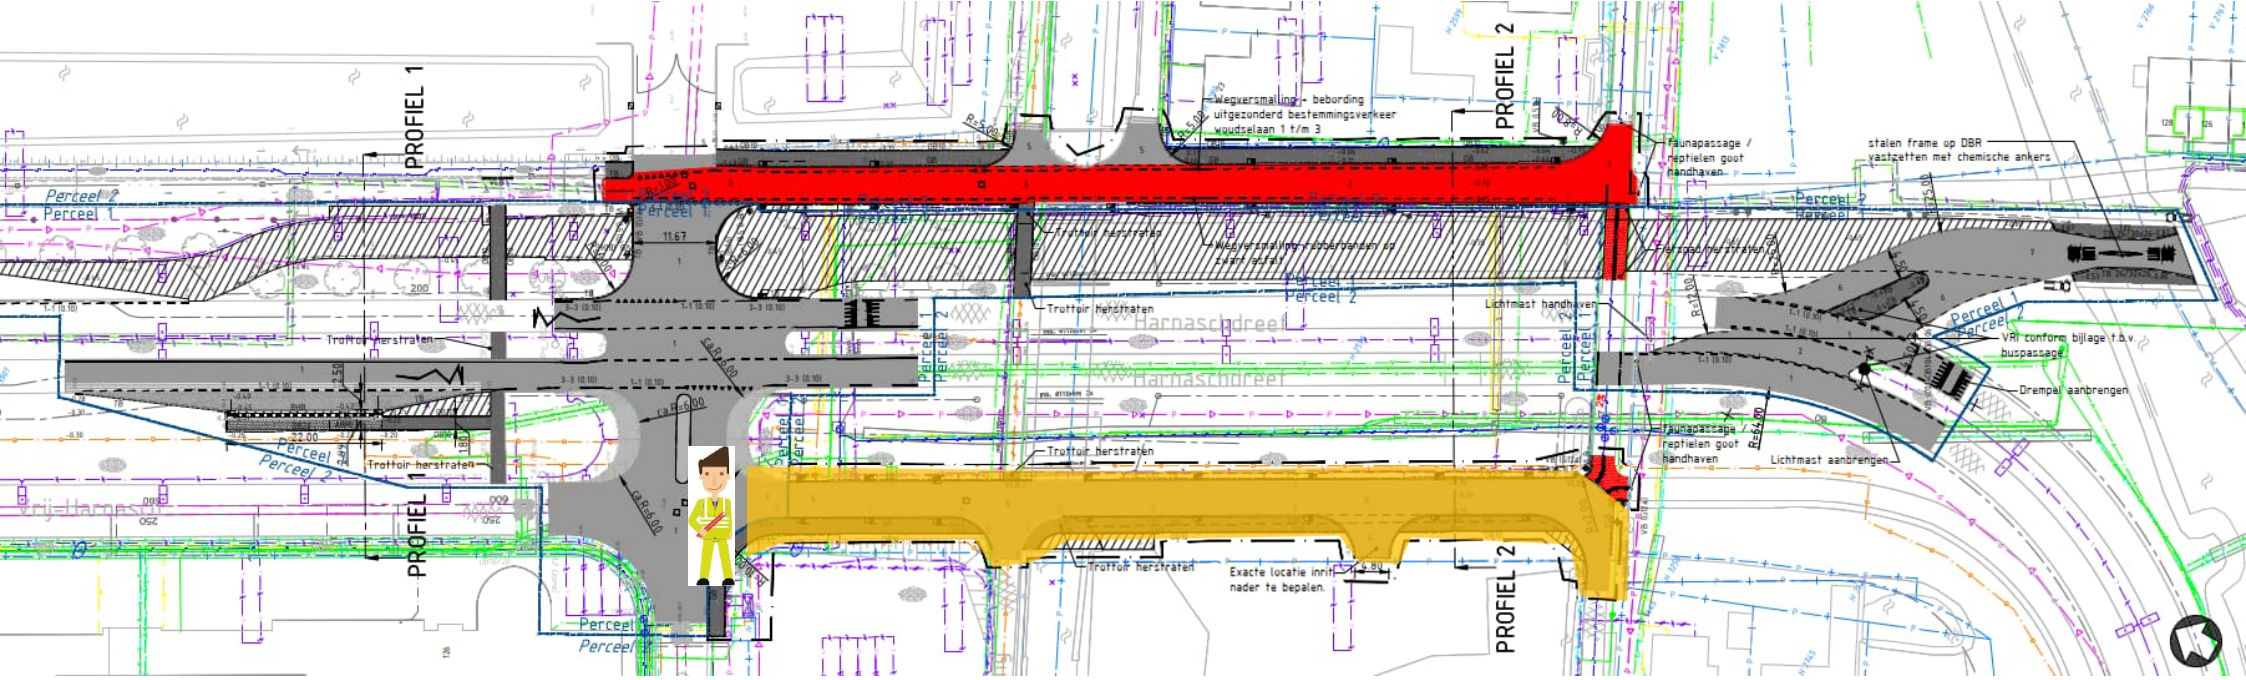


Vrijdag 14-4
11:00 – 13:00
Frezen aanzetten
50 cm frees

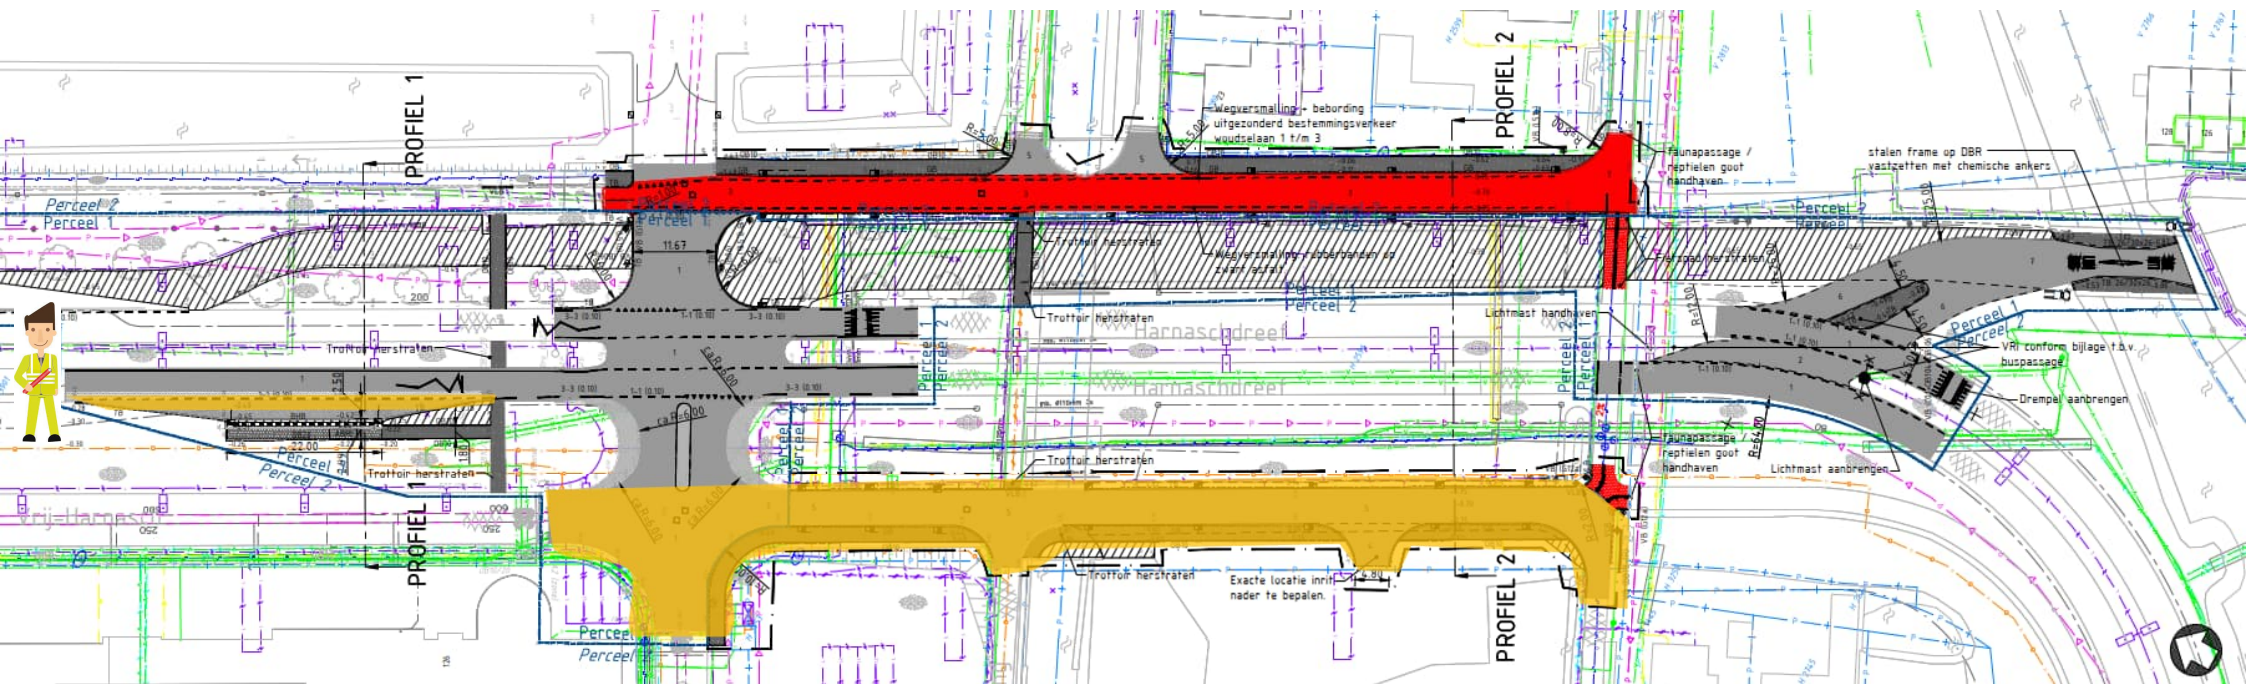


Vrijdag 14-4
11:00 – 13:00
Frezen aanzetten
50 cm frees

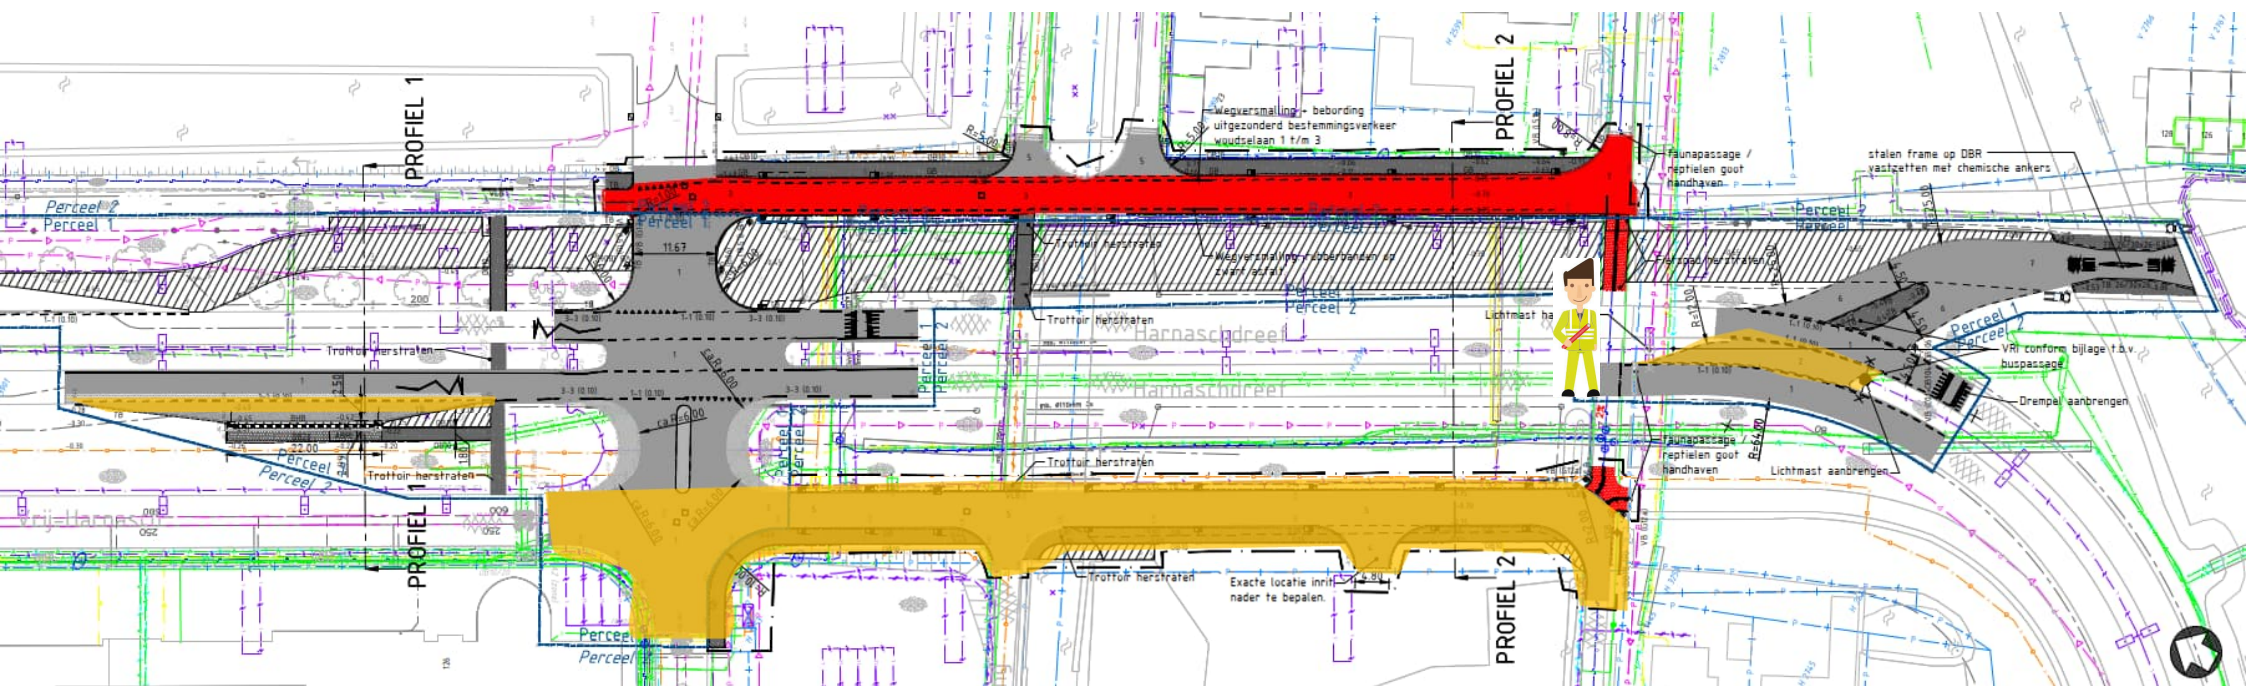


Vrijdag 14-4
11:00 – 13:00
Frezen aanzetten
50 cm frees

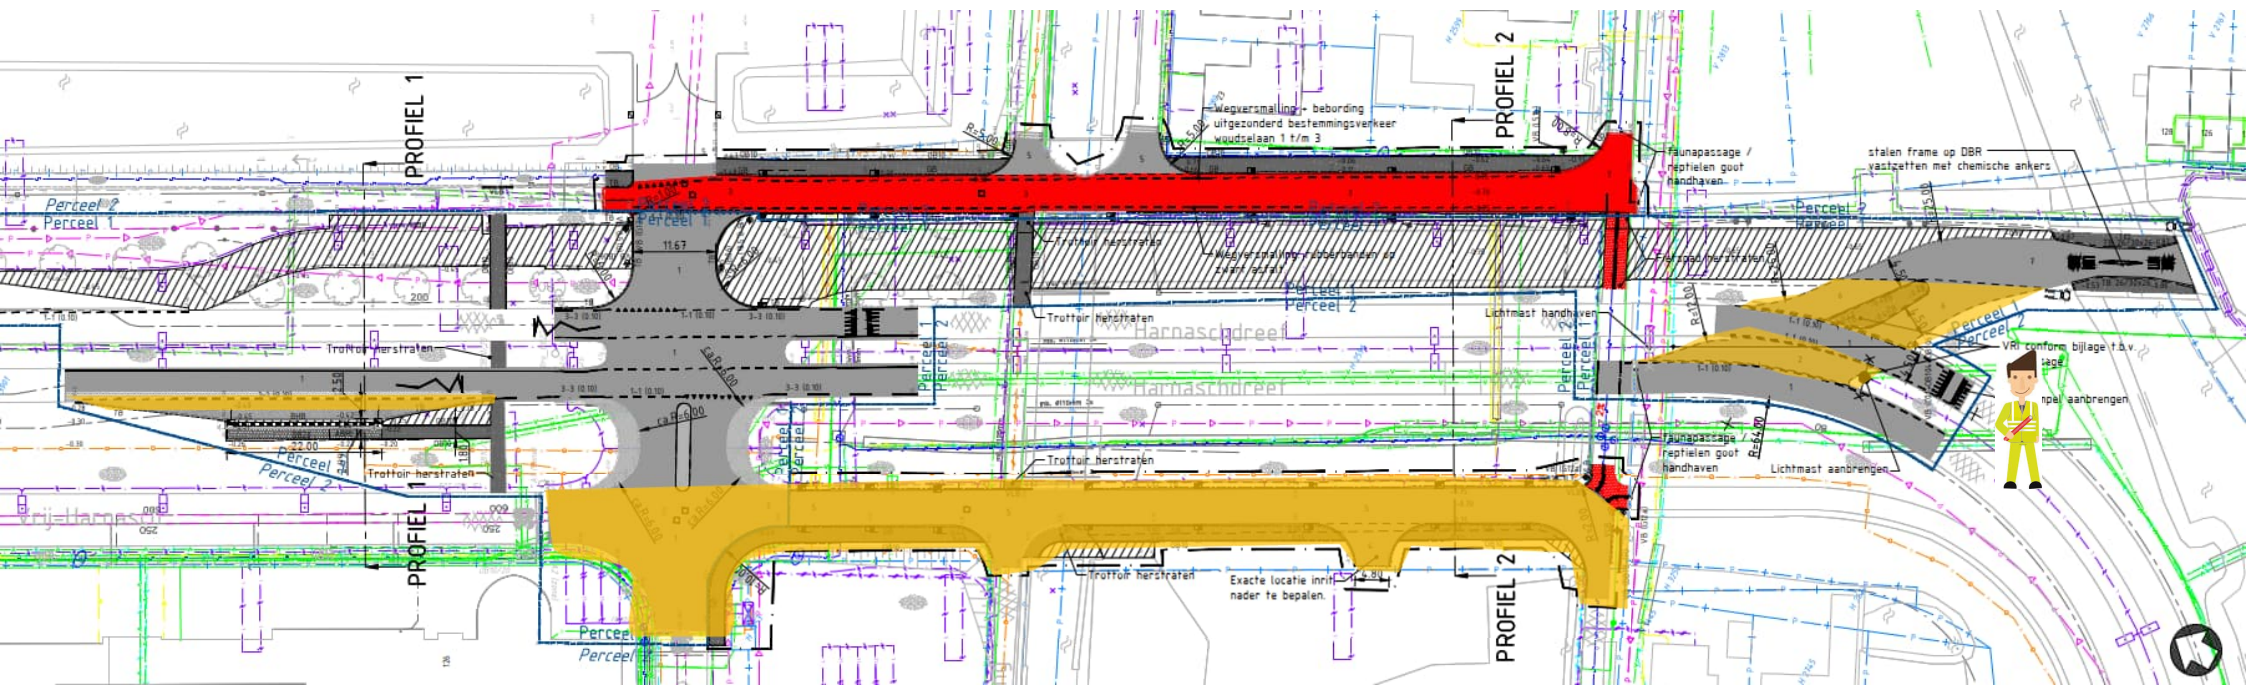


Vrijdag 14-4
7:00 – 12:00
Ontgraven doorsteek
Mobiële kraan + transport

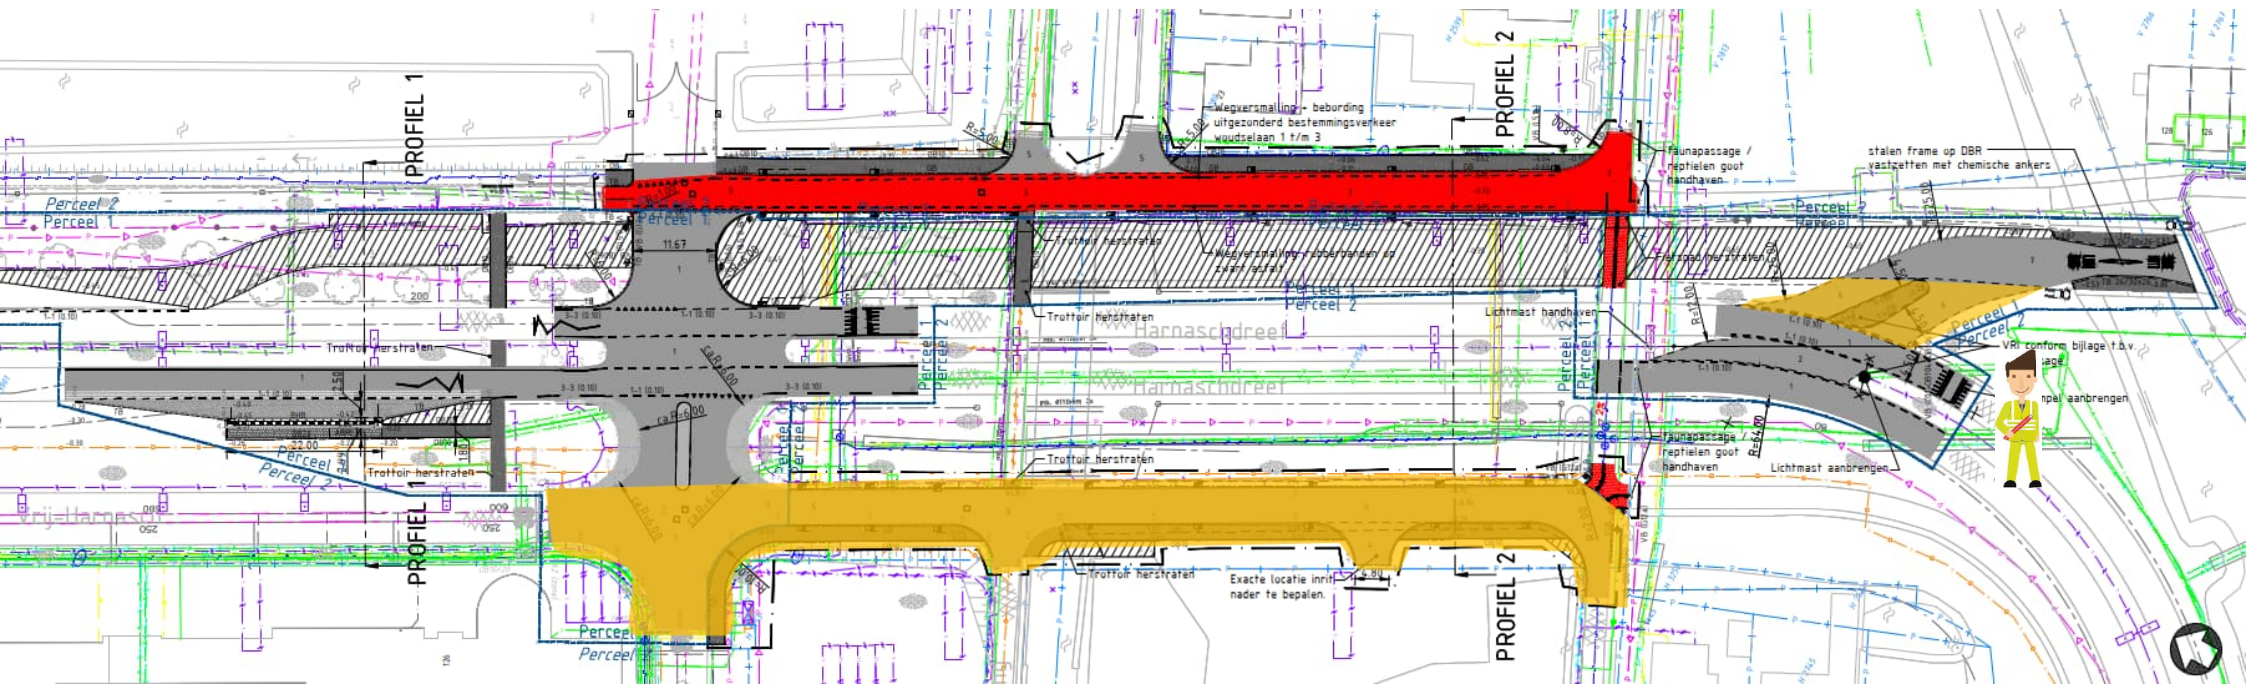


Vrijdag 14-4
12:00 – 16:00
Ontgraven doorsteek
Mobiële kraan + transport

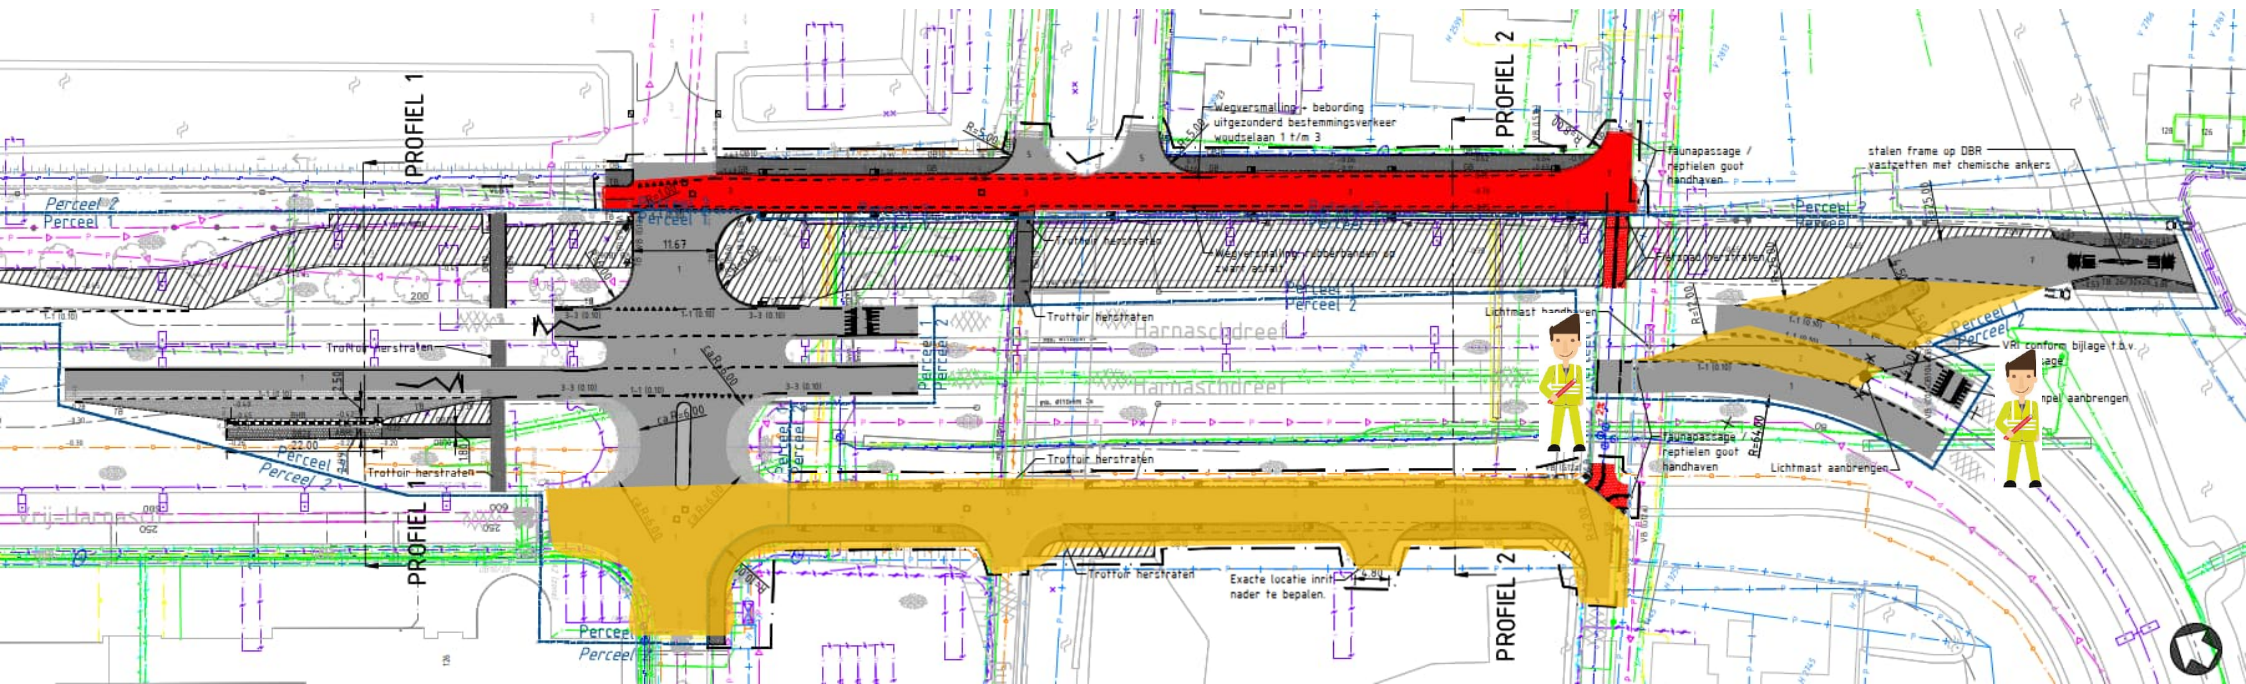


Vrijdag 14-4
20:00 – 00:00
Aanbrengen asfalt onderlagen

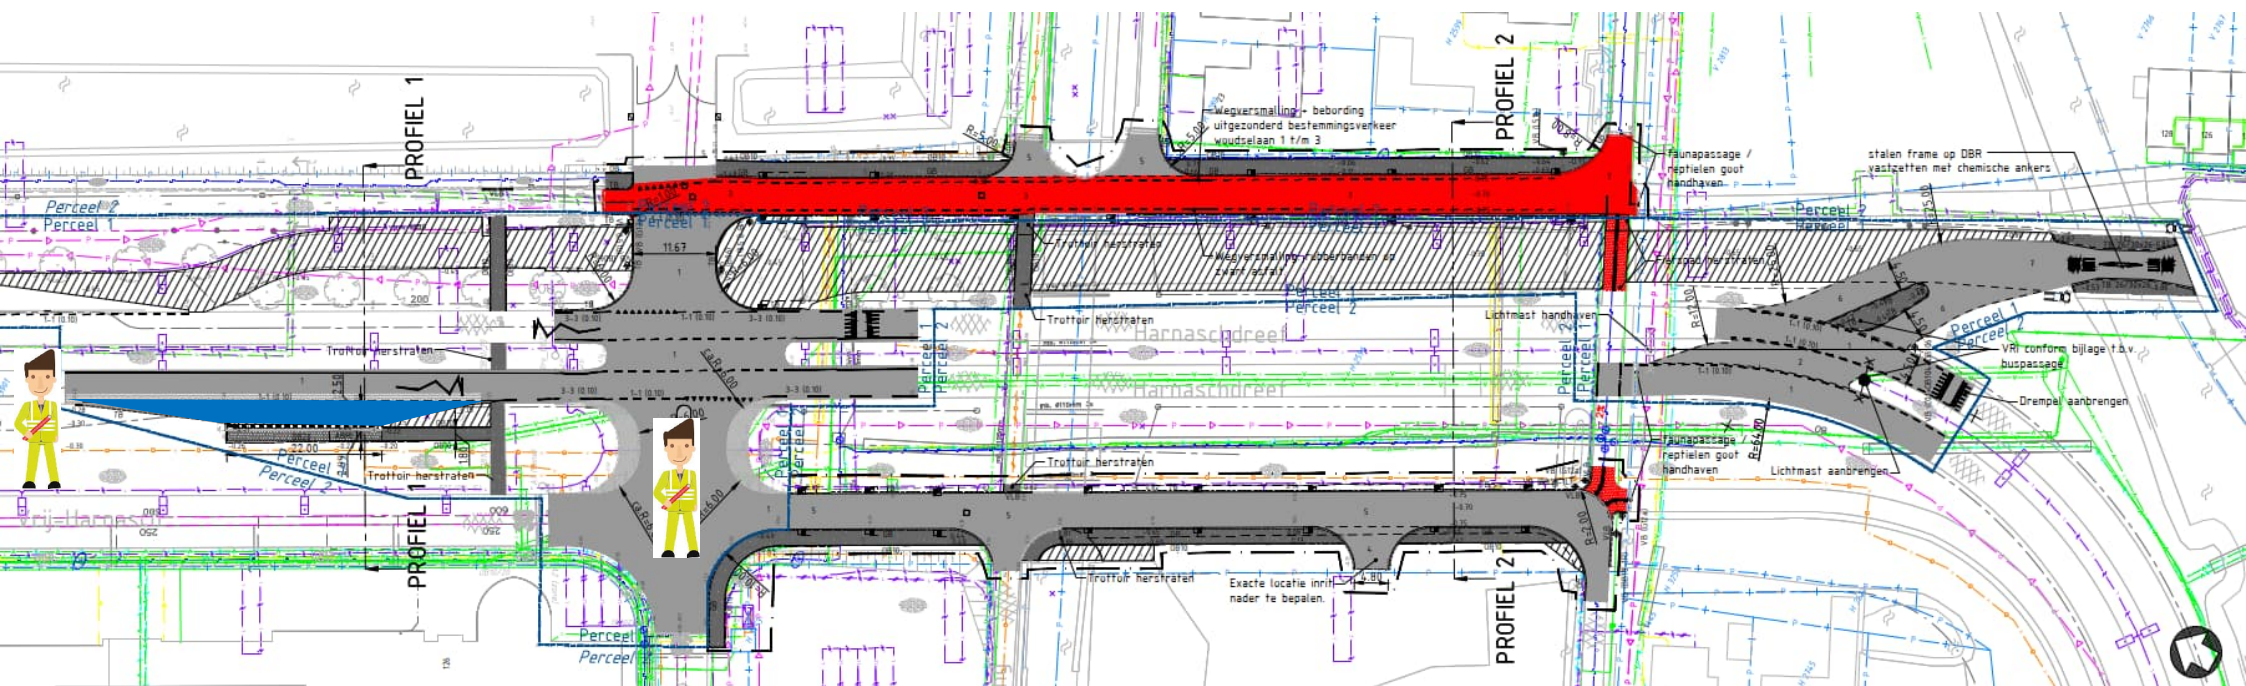


Vrijdag 14-4
20:00 – 00:00
Aanbrengen asfalt onderlagen

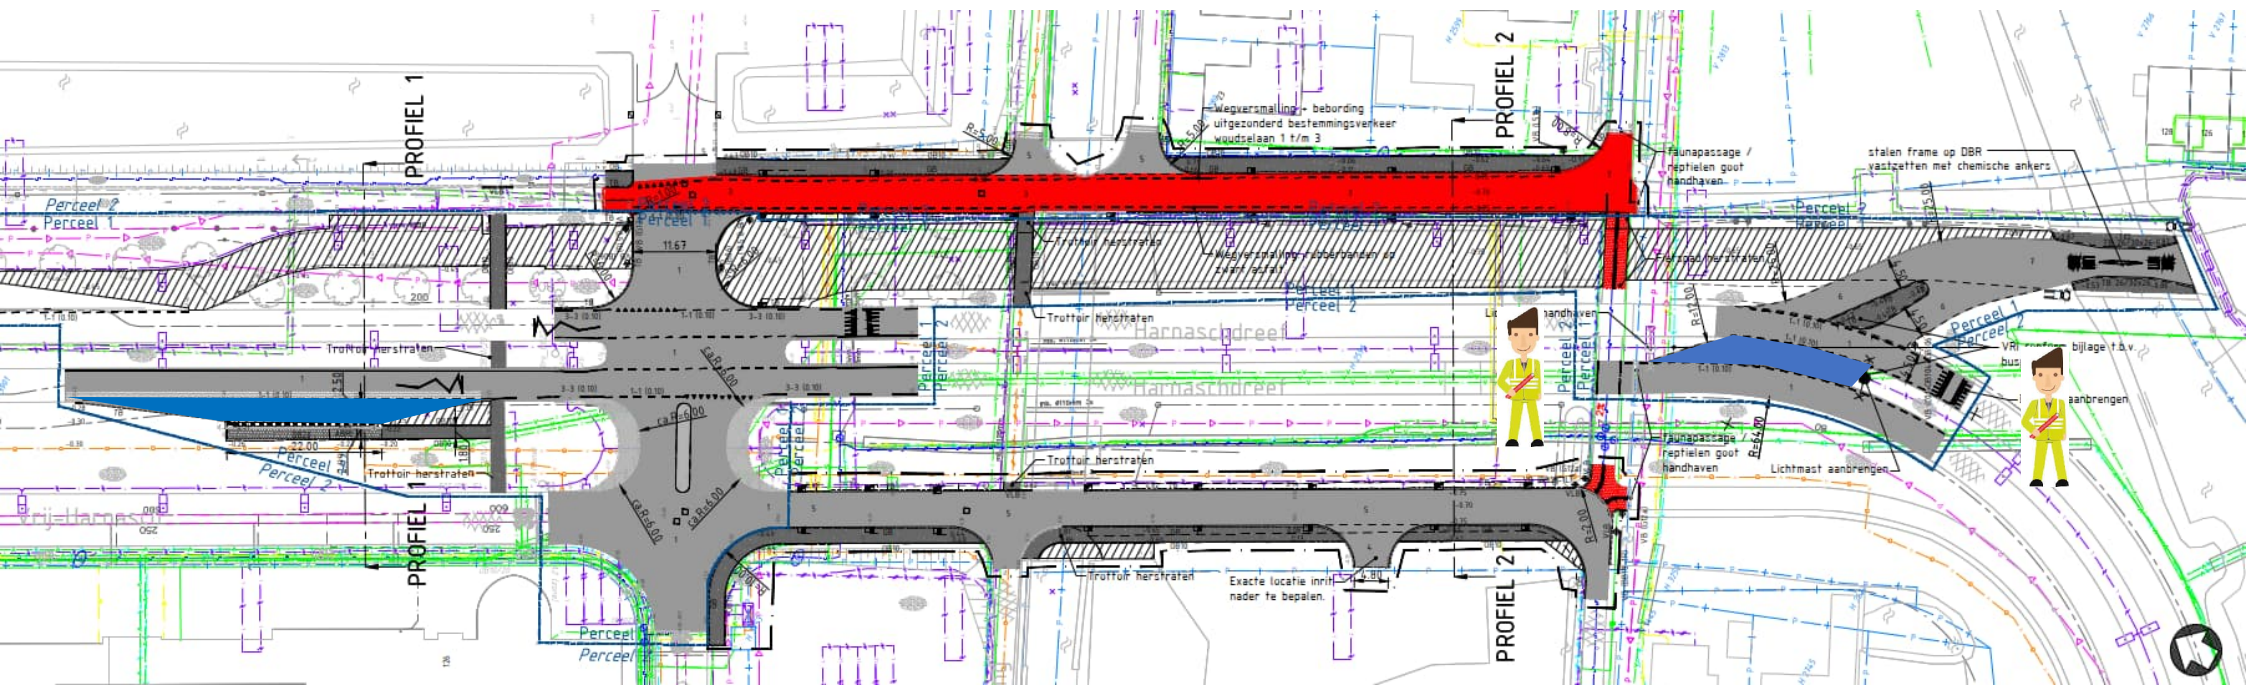


Vrijdag 14-4
20:00 – 00:00
Aanbrengen asfalt onderlagen

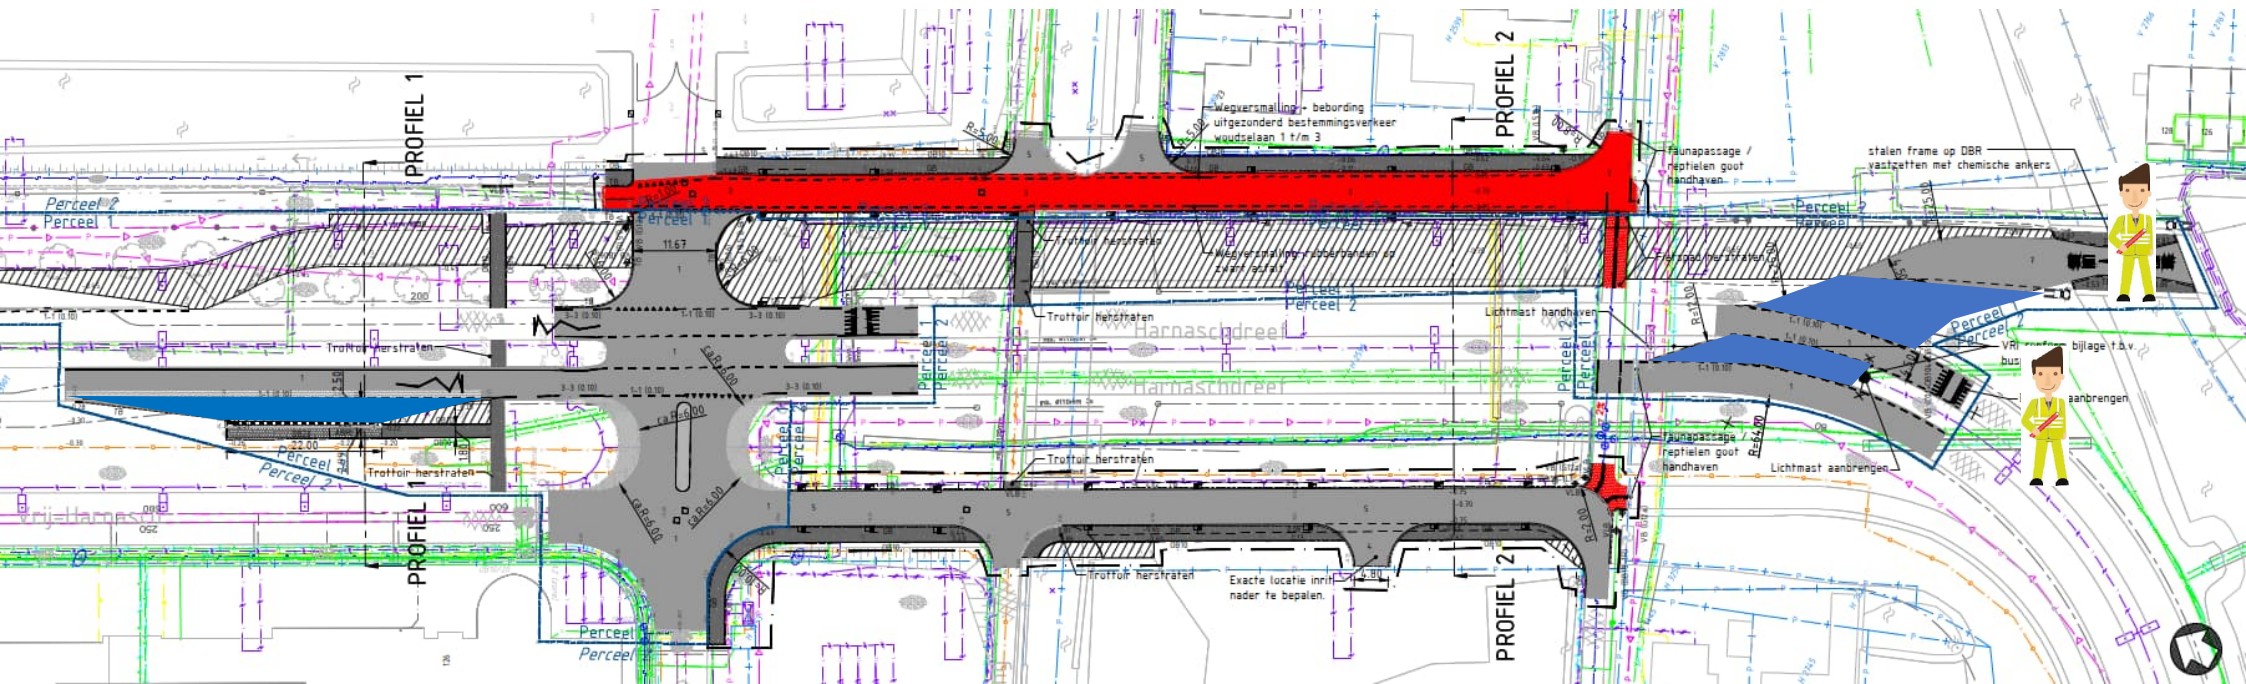


Vrijdag 14-4
20:00 – 00:00
Aanbrengen asfalt onderlagen

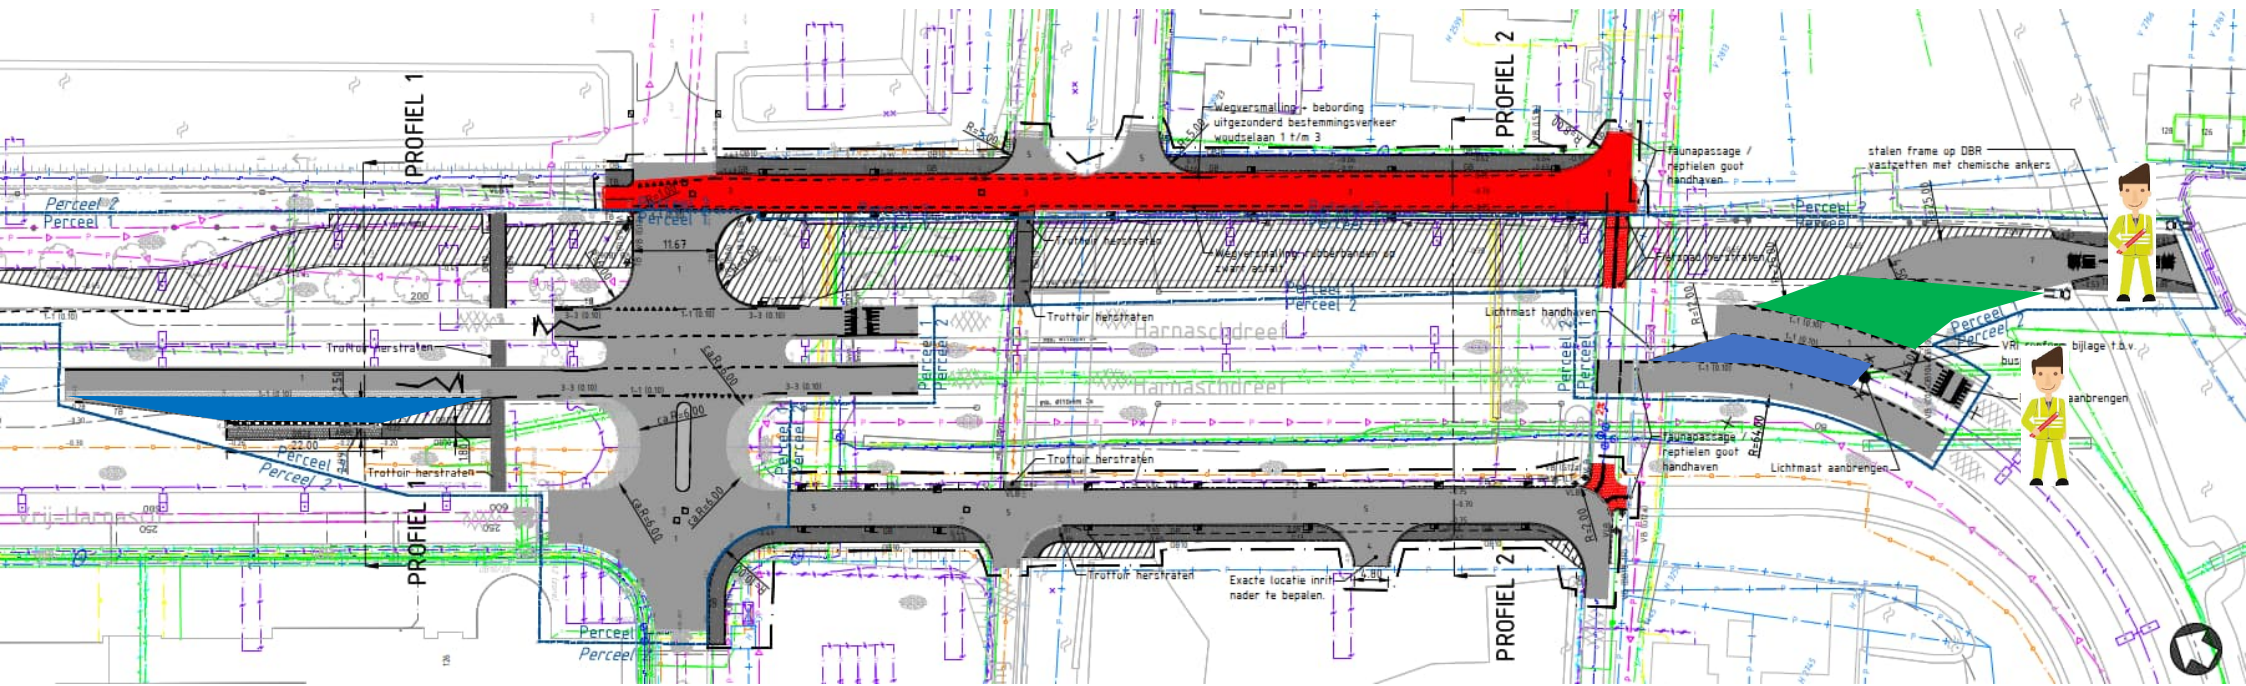


Vrijdag 14-4
20:00 – 00:00
Aanbrengen asfalt onderlagen

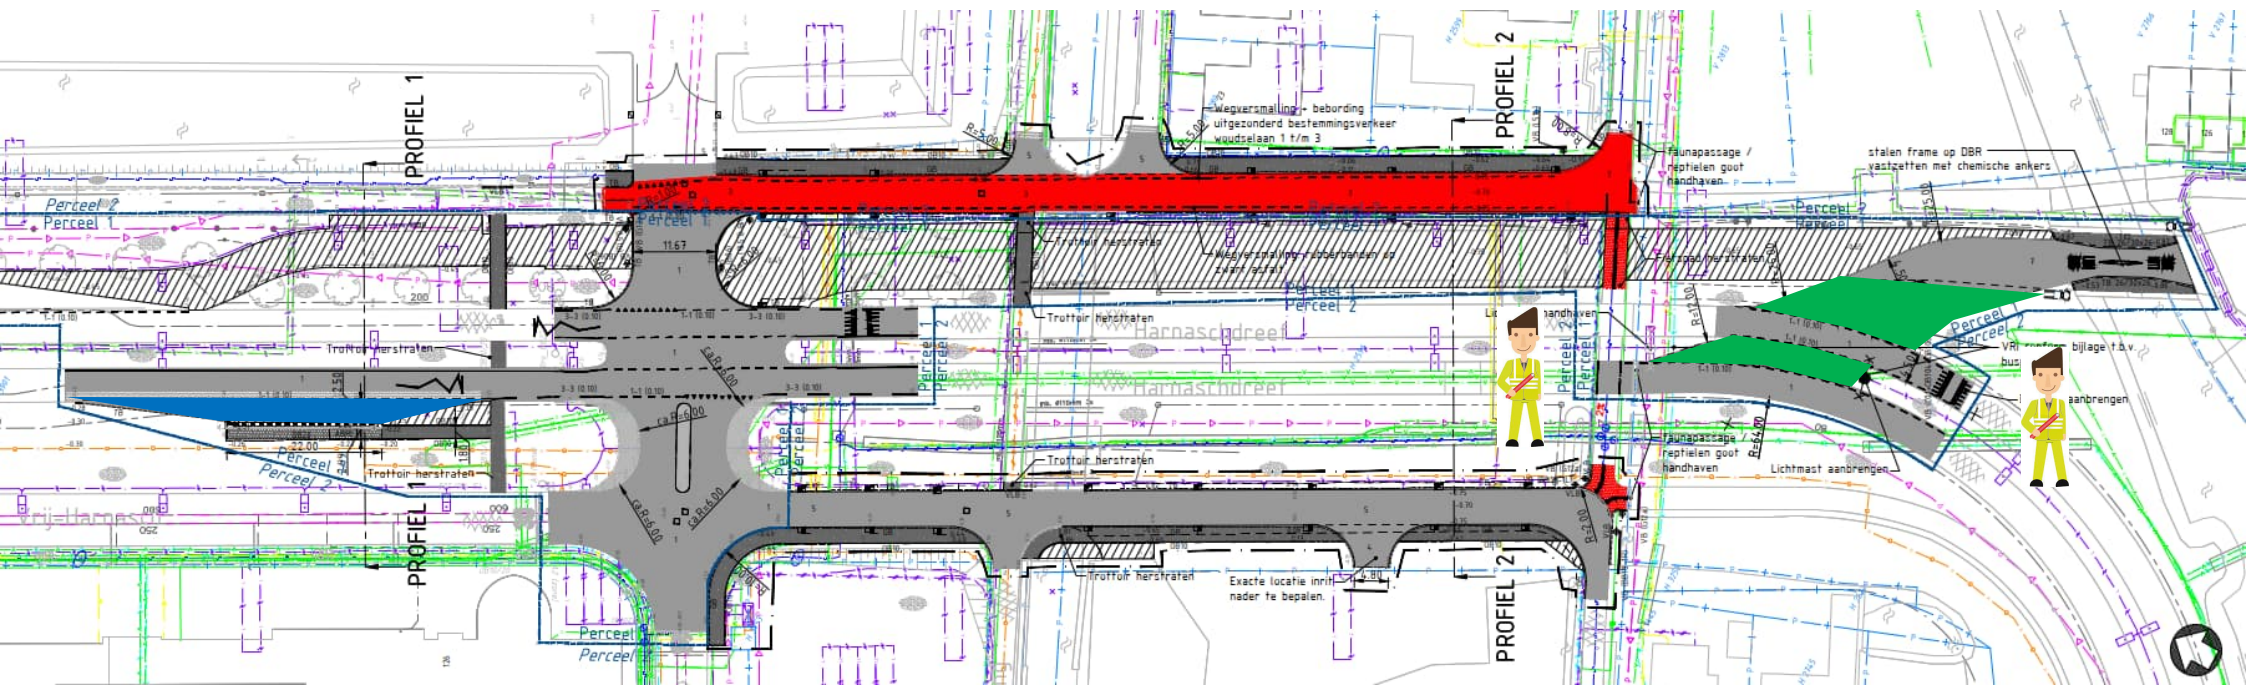


Vrijdag 14-4
20:00 – 00:00
Aanbrengen asfalt onderlagen

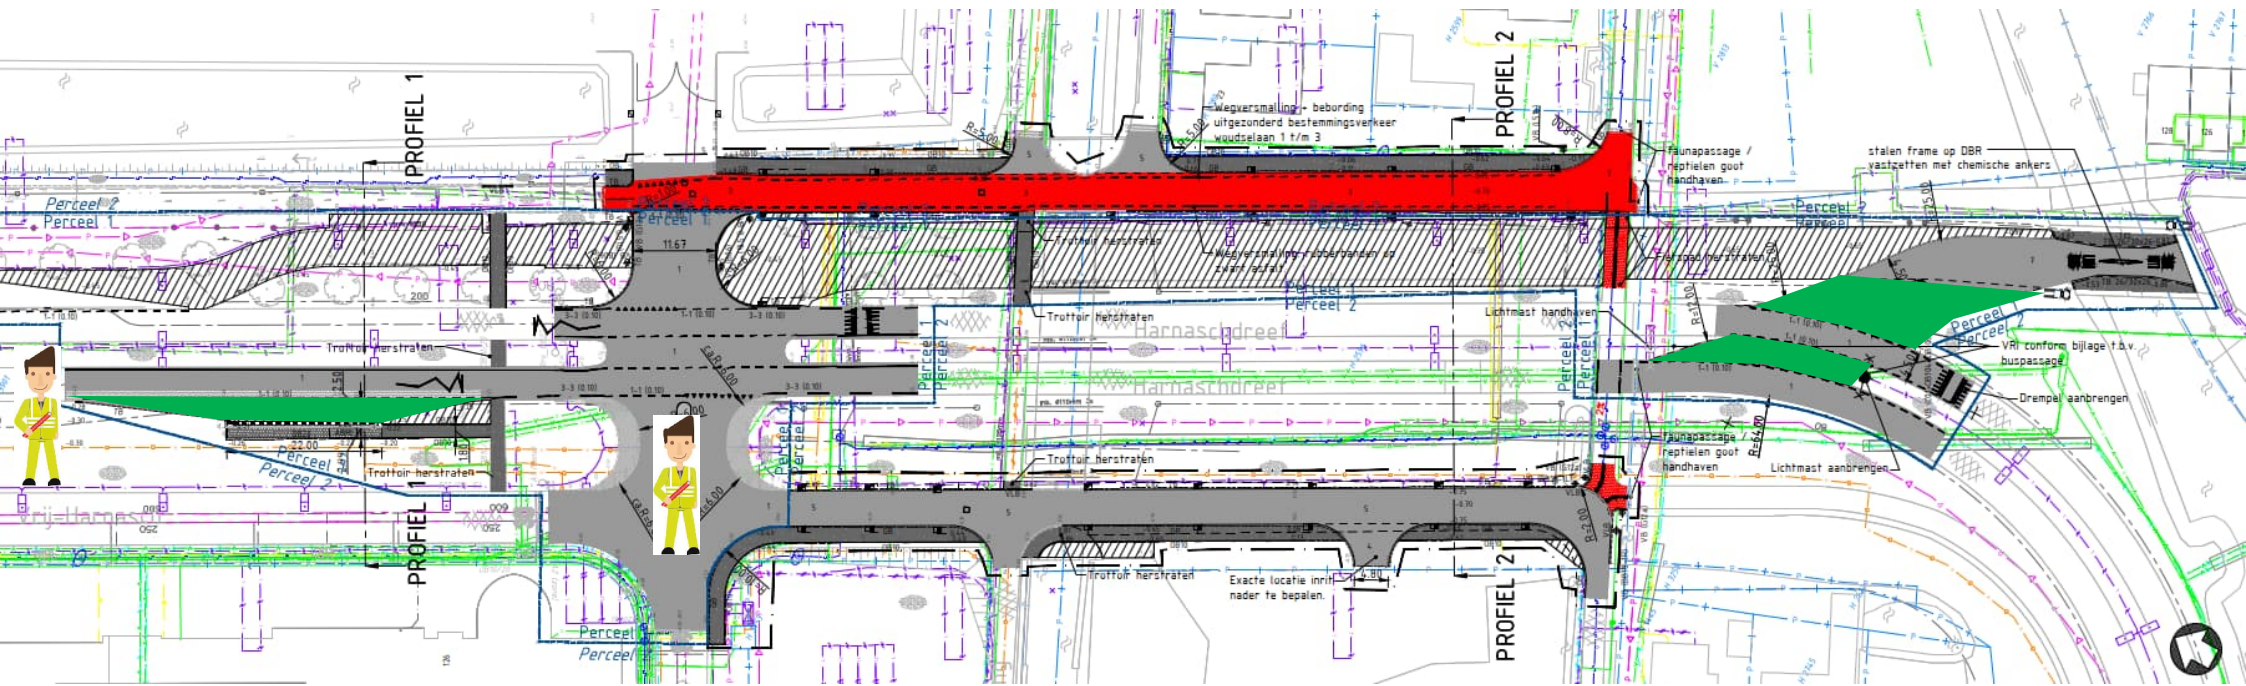

Zaterdag 15-4
00:00 – 04:00
Aanbrengen asfalt
Deklaag Vrij-Harnasch /
Woudselaan
Asfalt start kant
Woudselaan

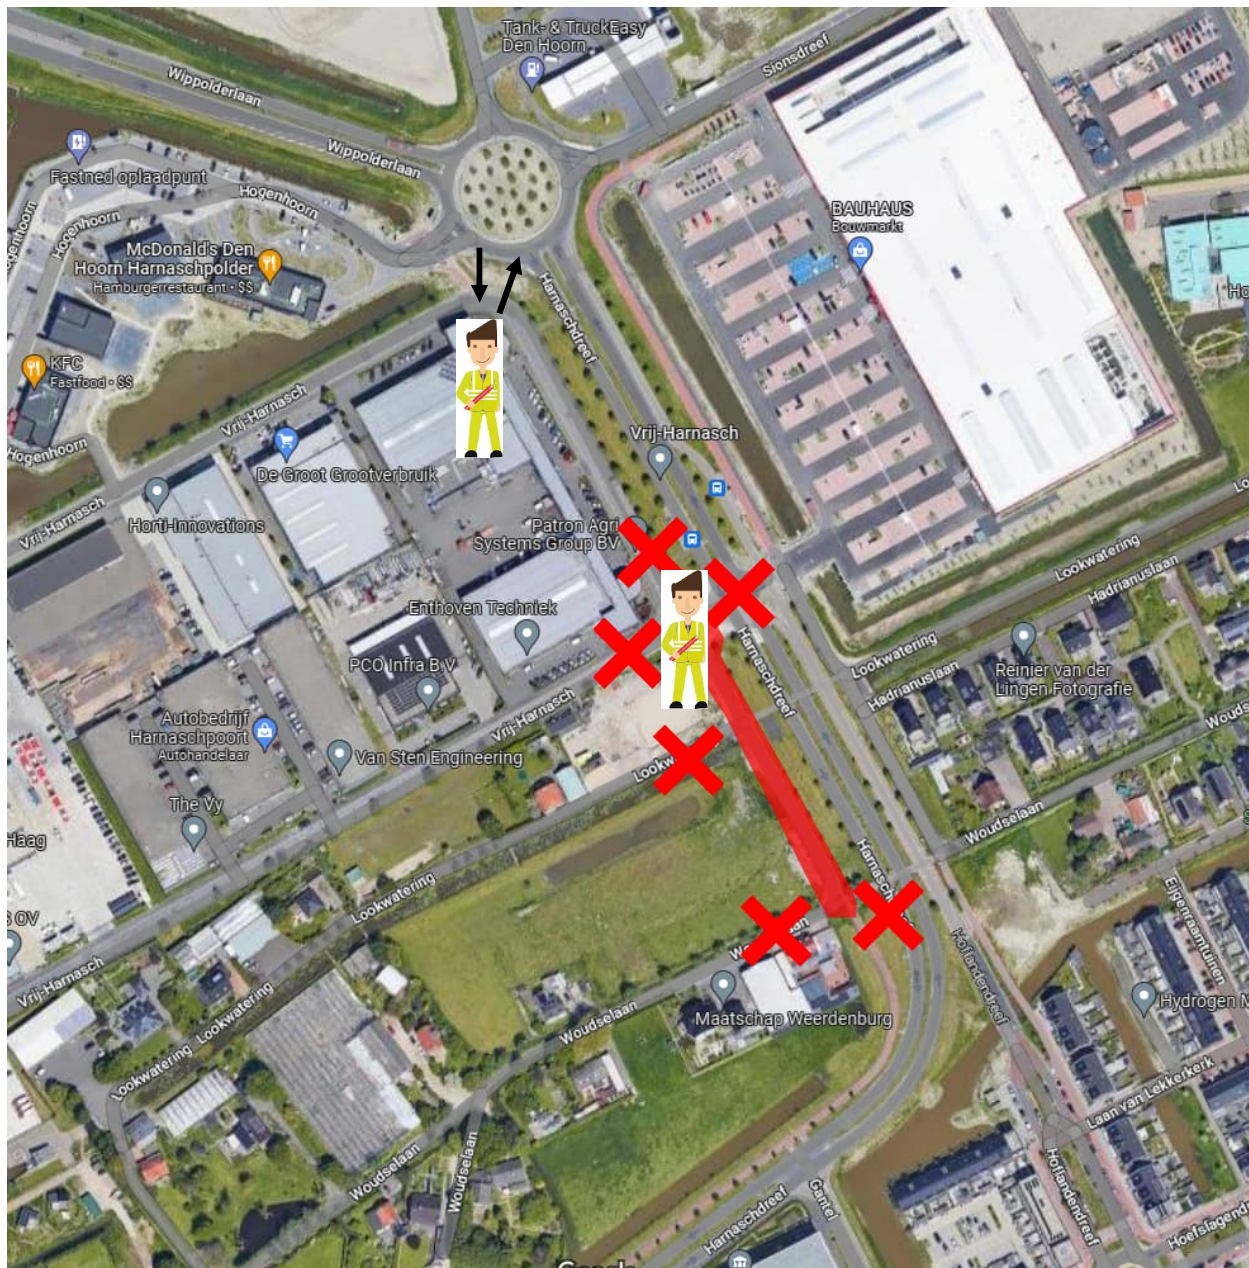


Zaterdag 15-4
00:00 – 04:00
Aanbrengen asfalt deklagen

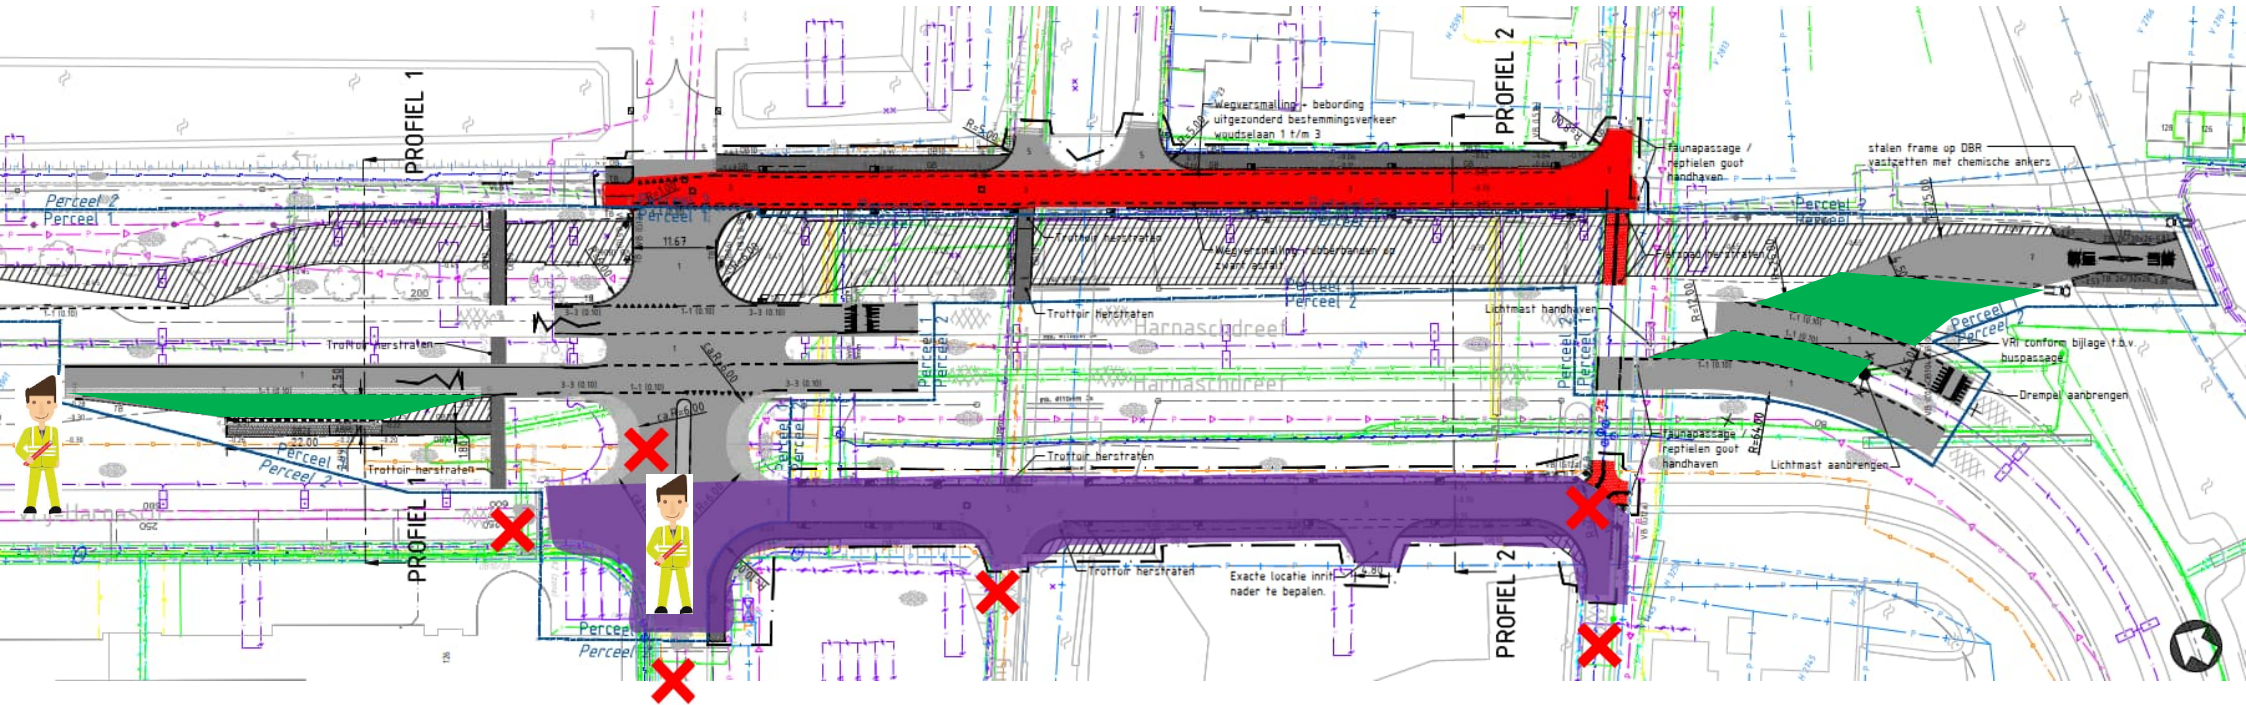

Zaterdag 15-4

06:00


Aanbrengen asfalt gereed

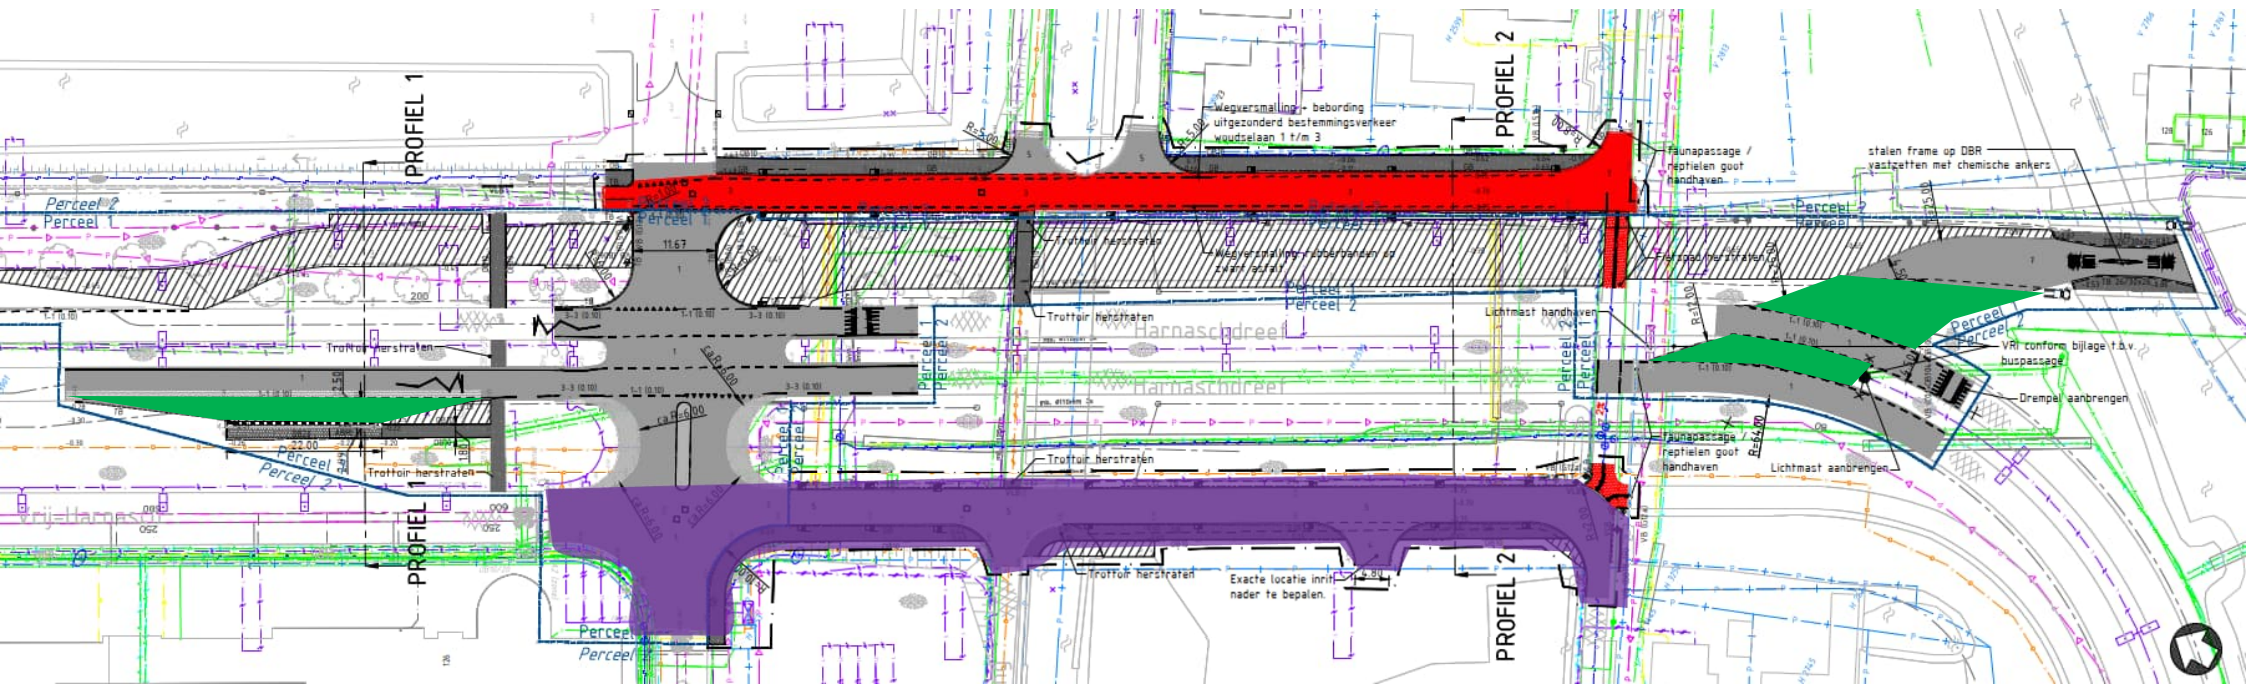


Weekendwerk 22, 23 en 24 april

Werkvak geheel afgesloten


Zaterdag 22-4
06:00 t/m
Zondag 23-4
23:59

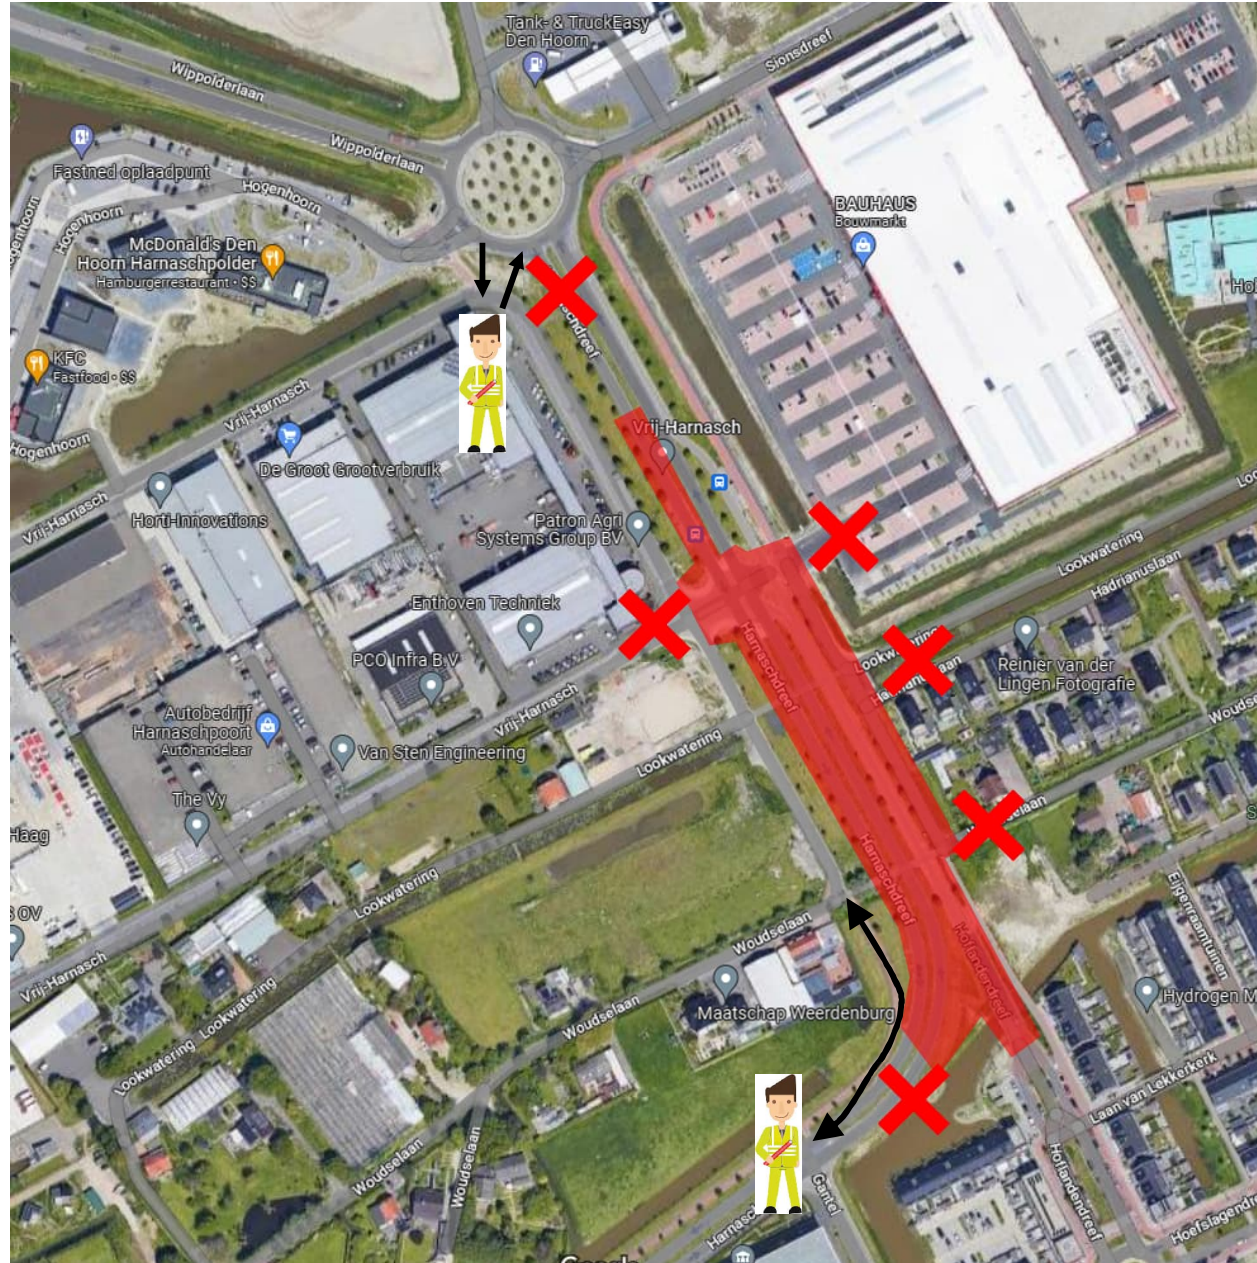


22 april

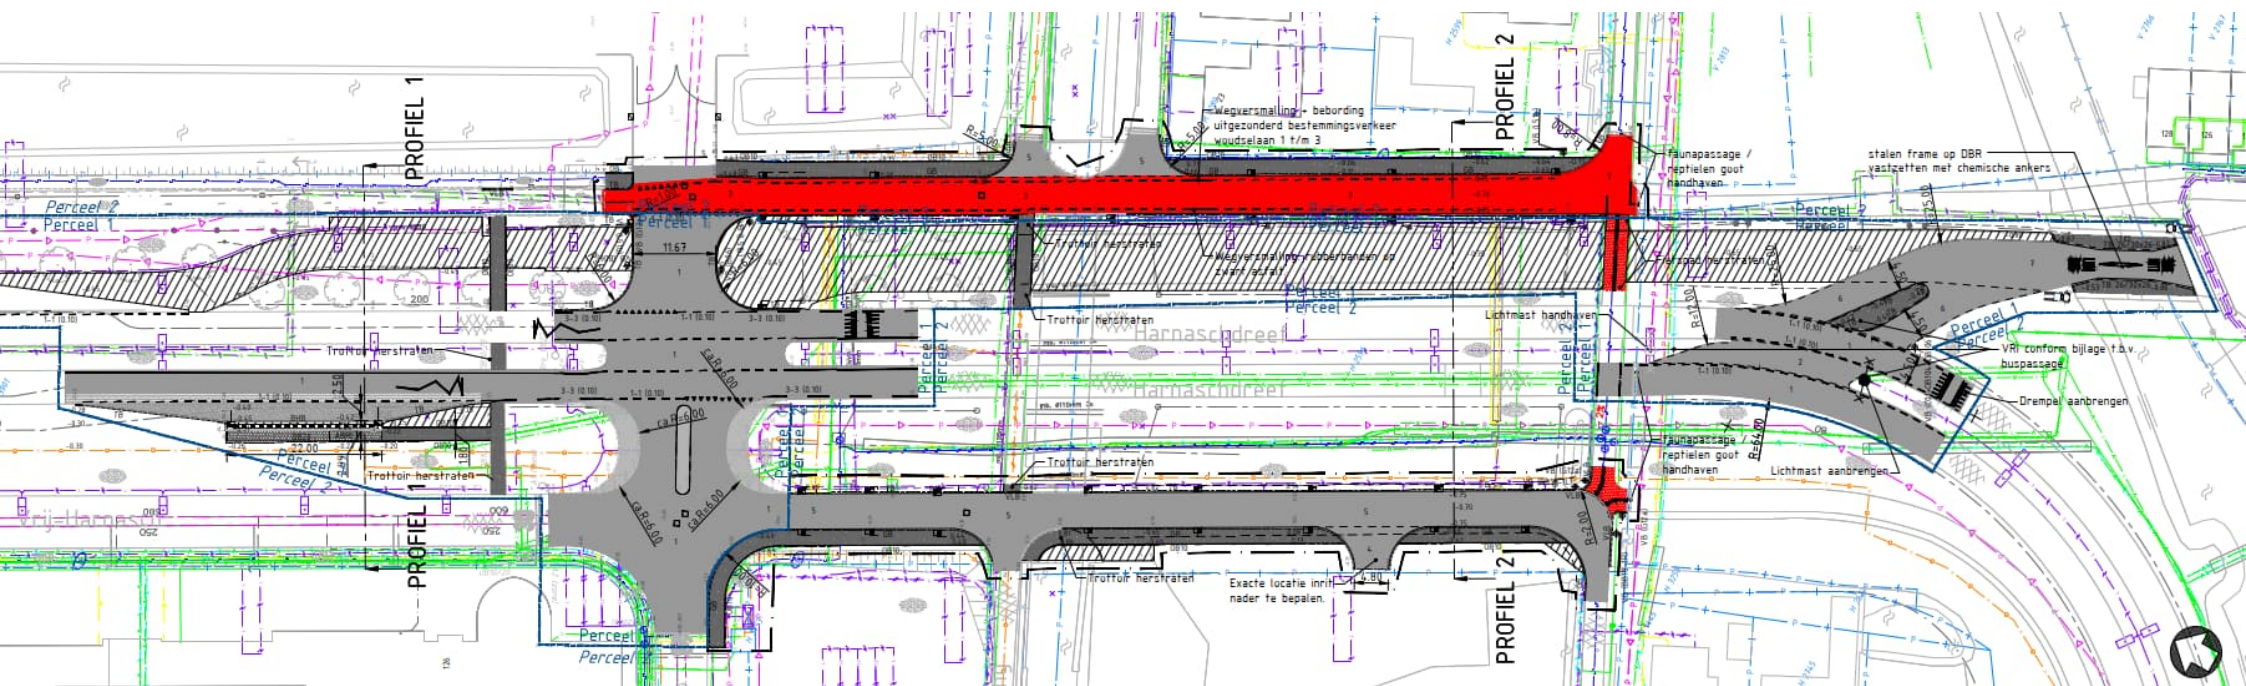


22 april
7:00-15:00
Frezen deklagen
+ vegen
Uitbreken/aanbrengen bestrating

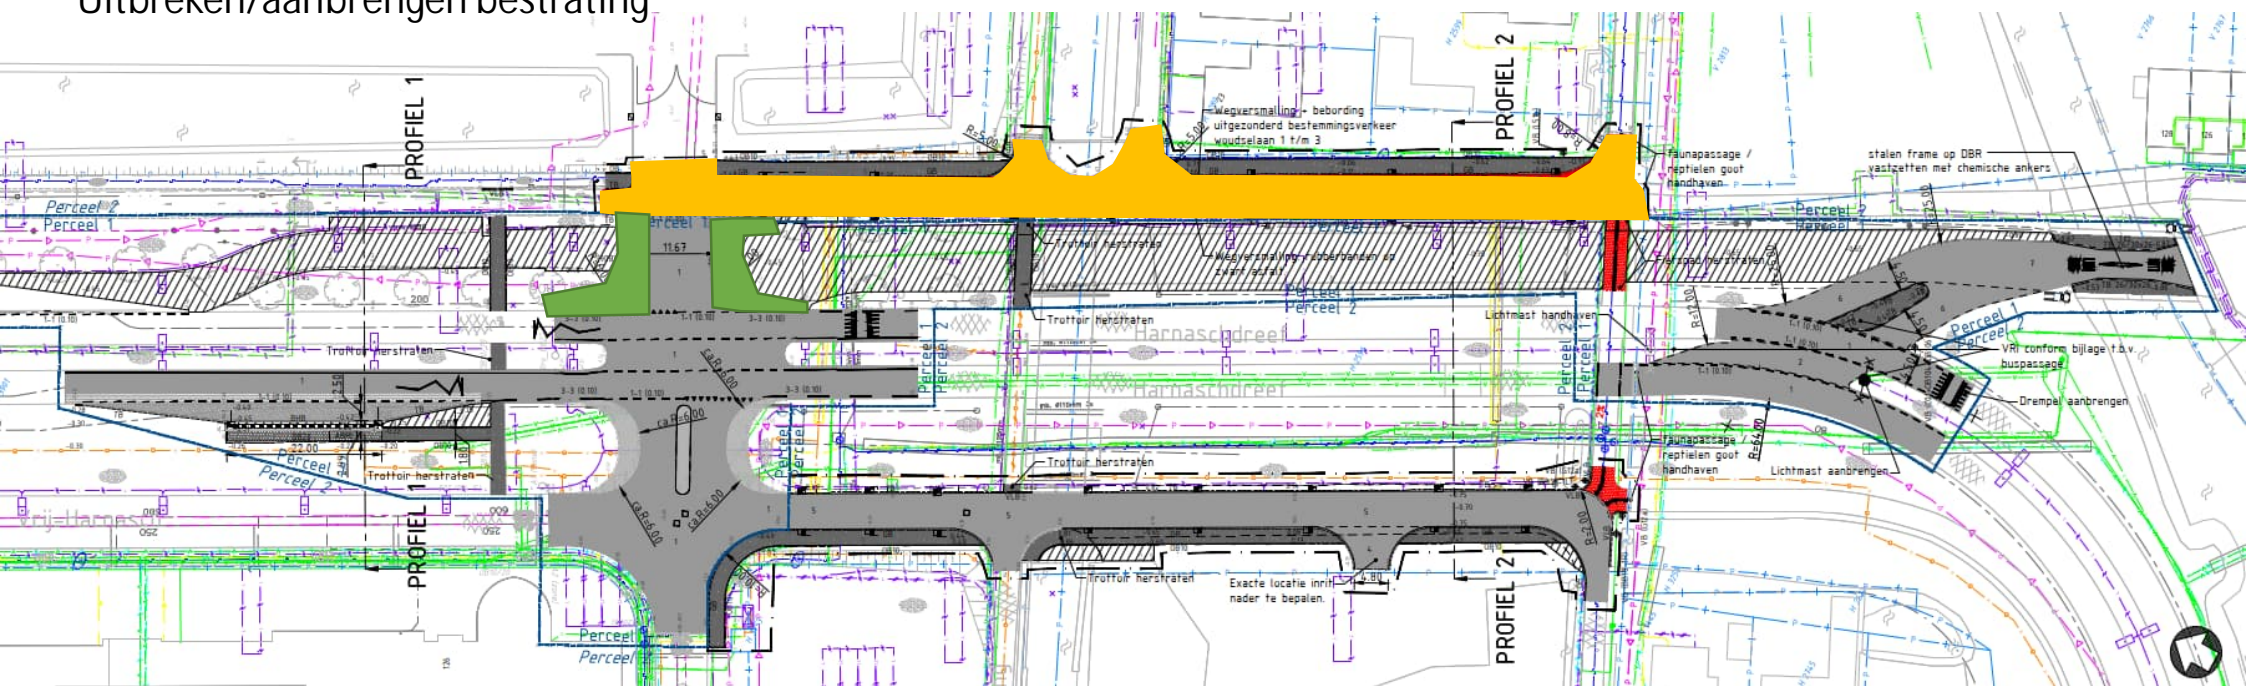


22 april
7:00-15:00
Frezen deklagen
+ vegen

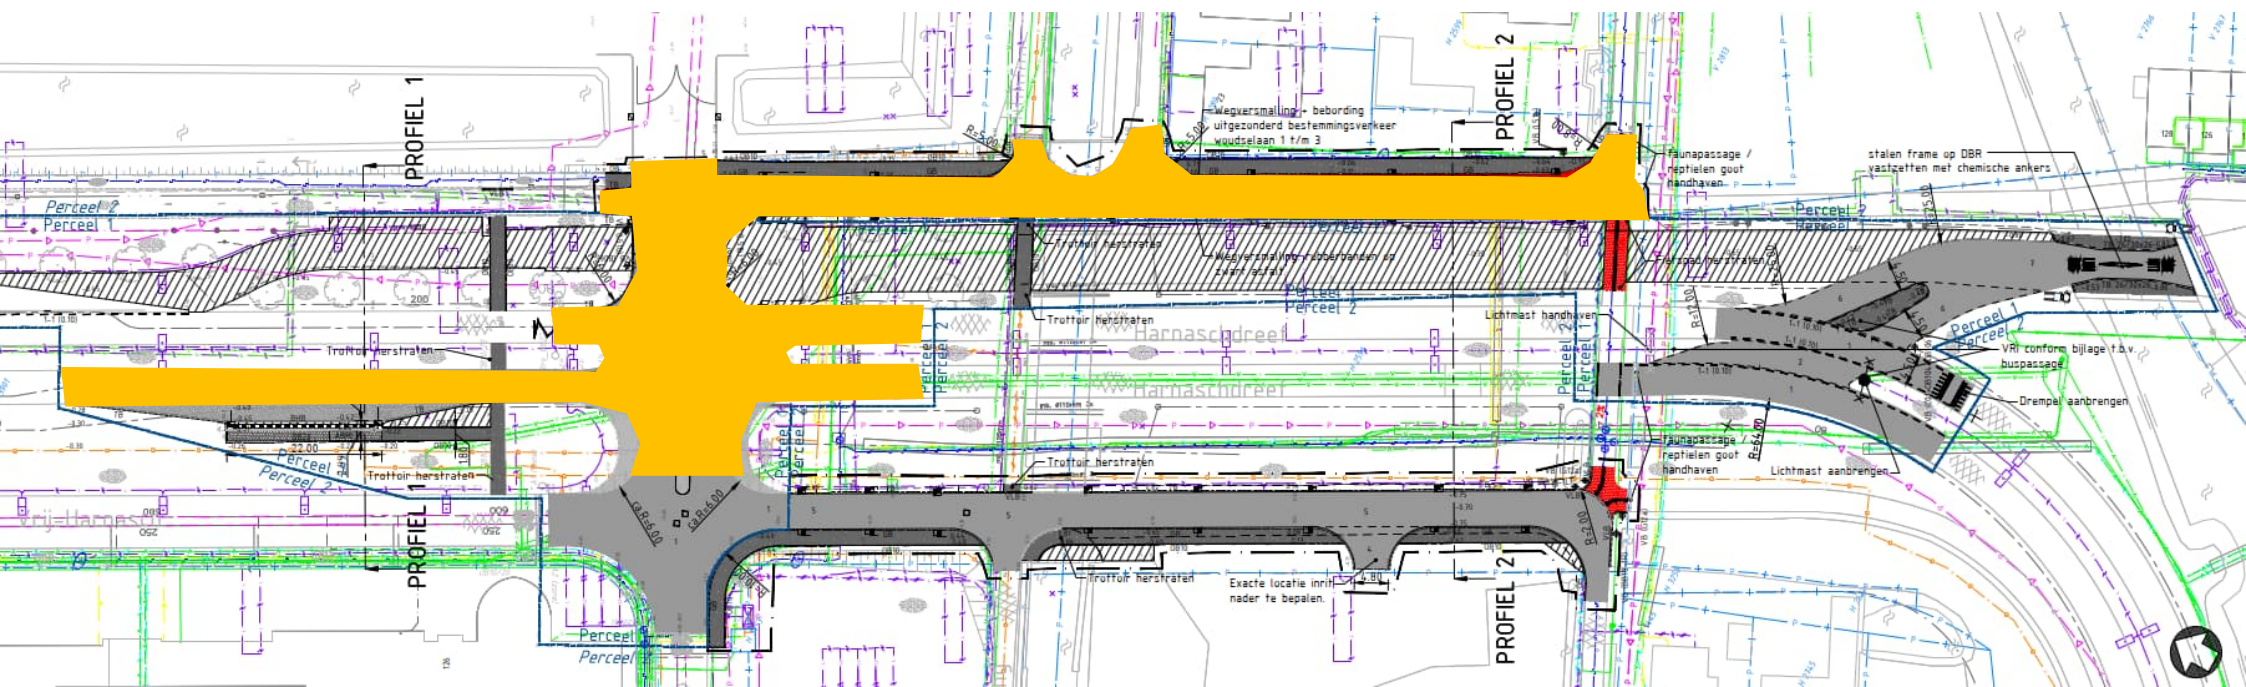


22 april
7:00-15:00
Frezen deklagen
+ vegen

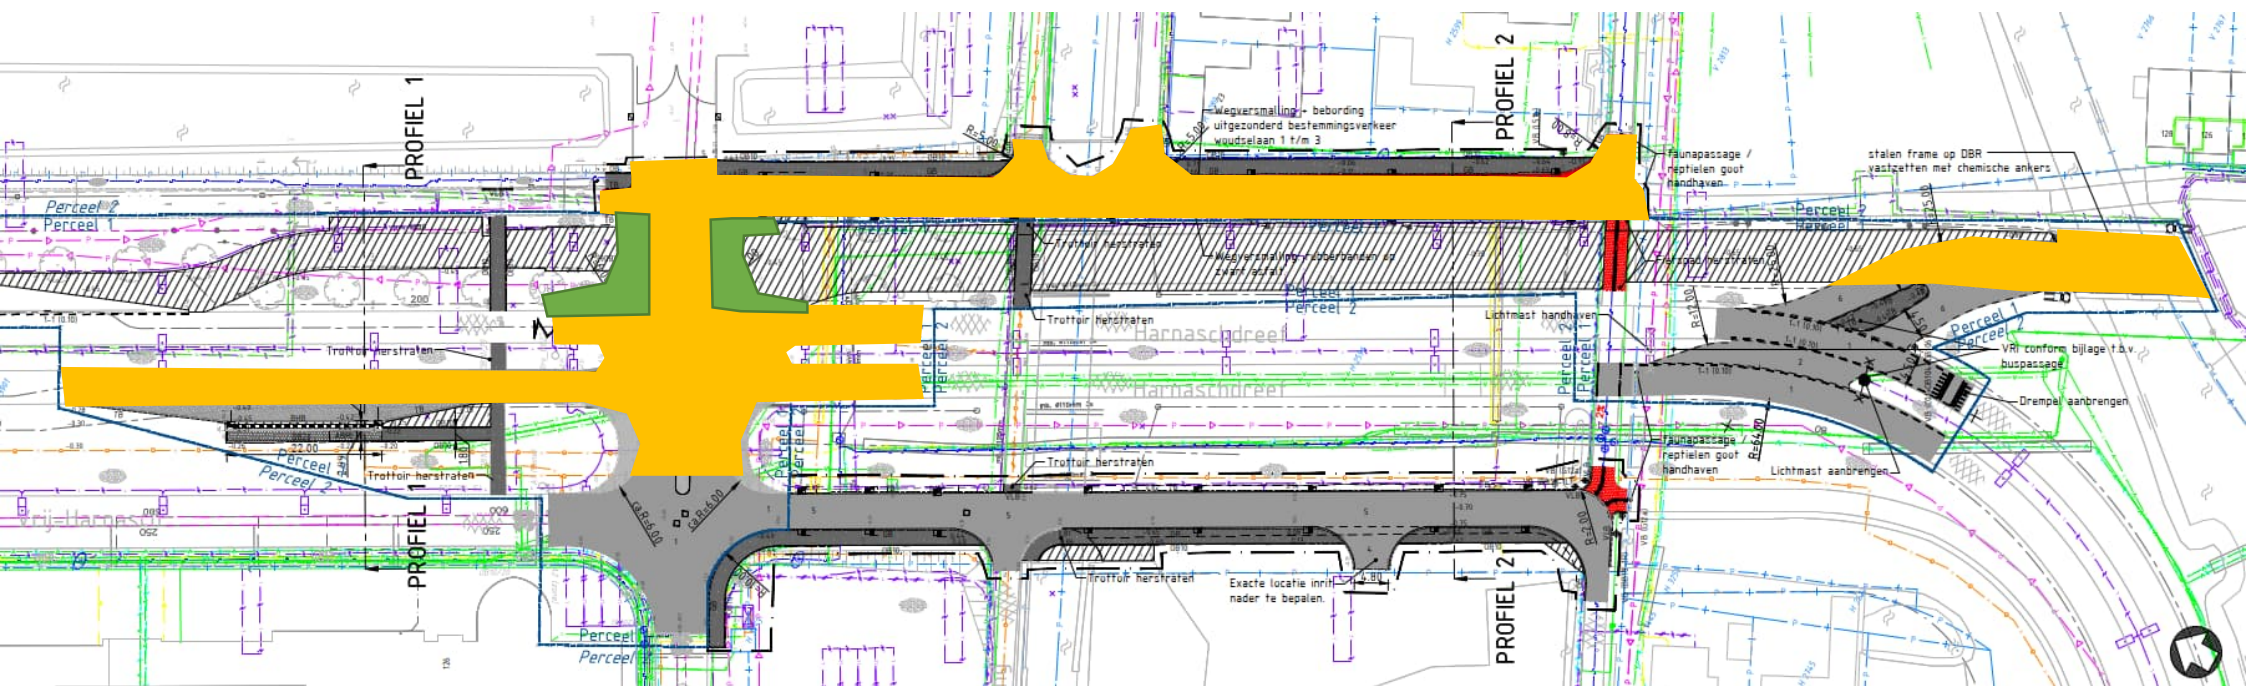


22 april
7:00-15:00
Frezen deklagen
+ vegen

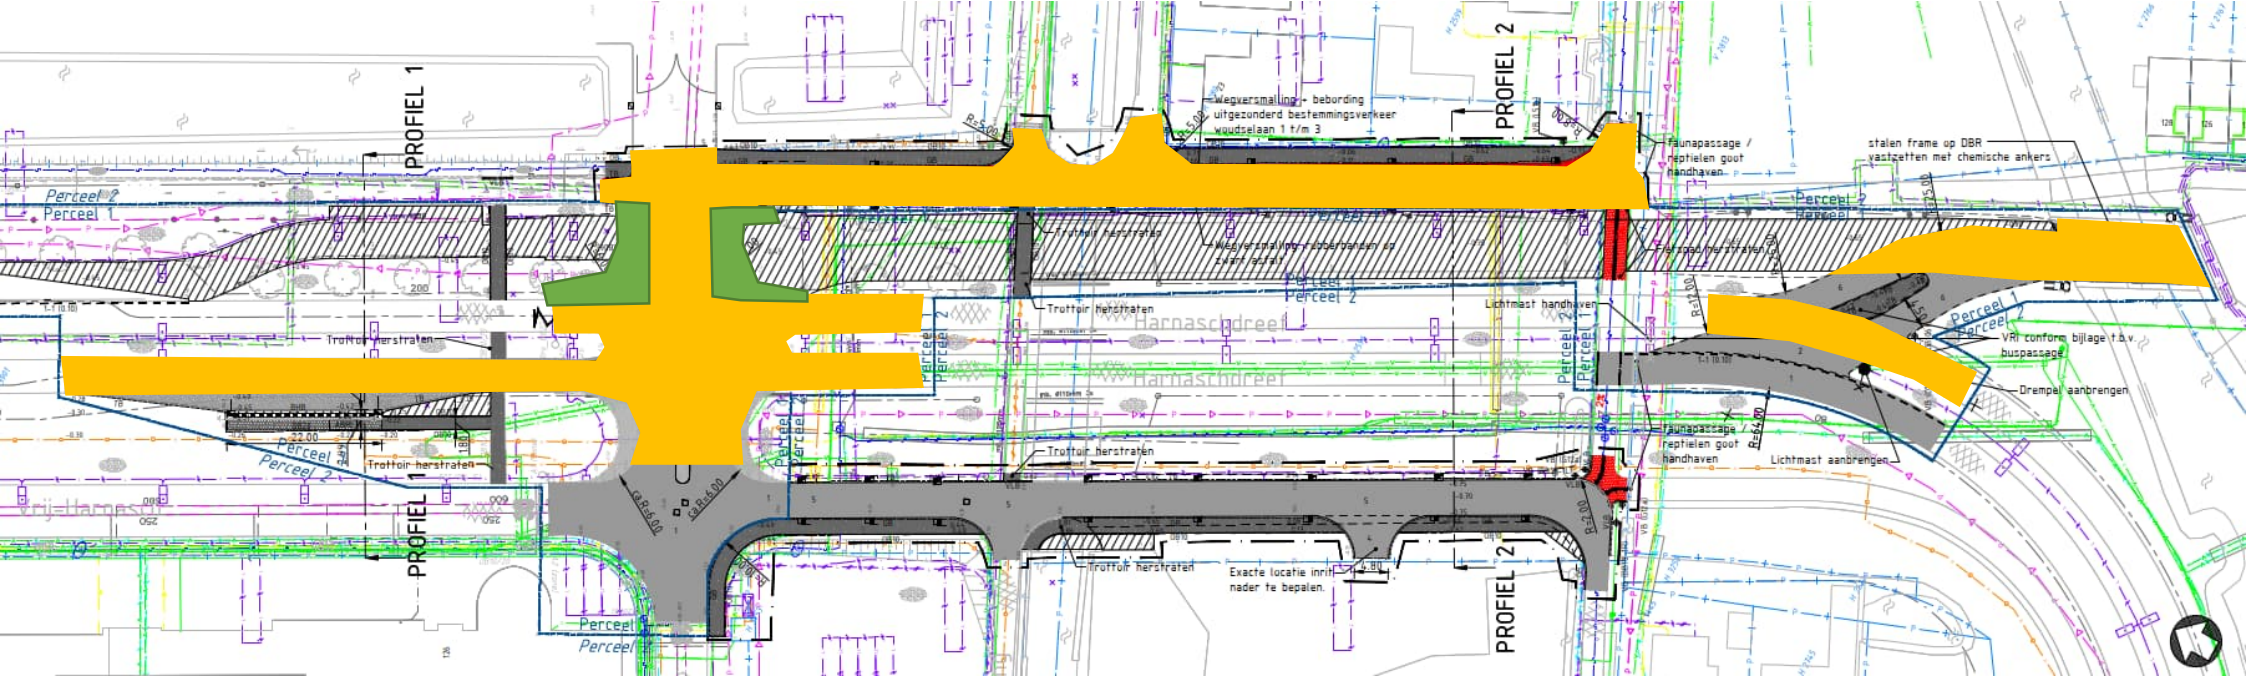

22 april
7:00-15:00
Frezen deklagen
+ vegen

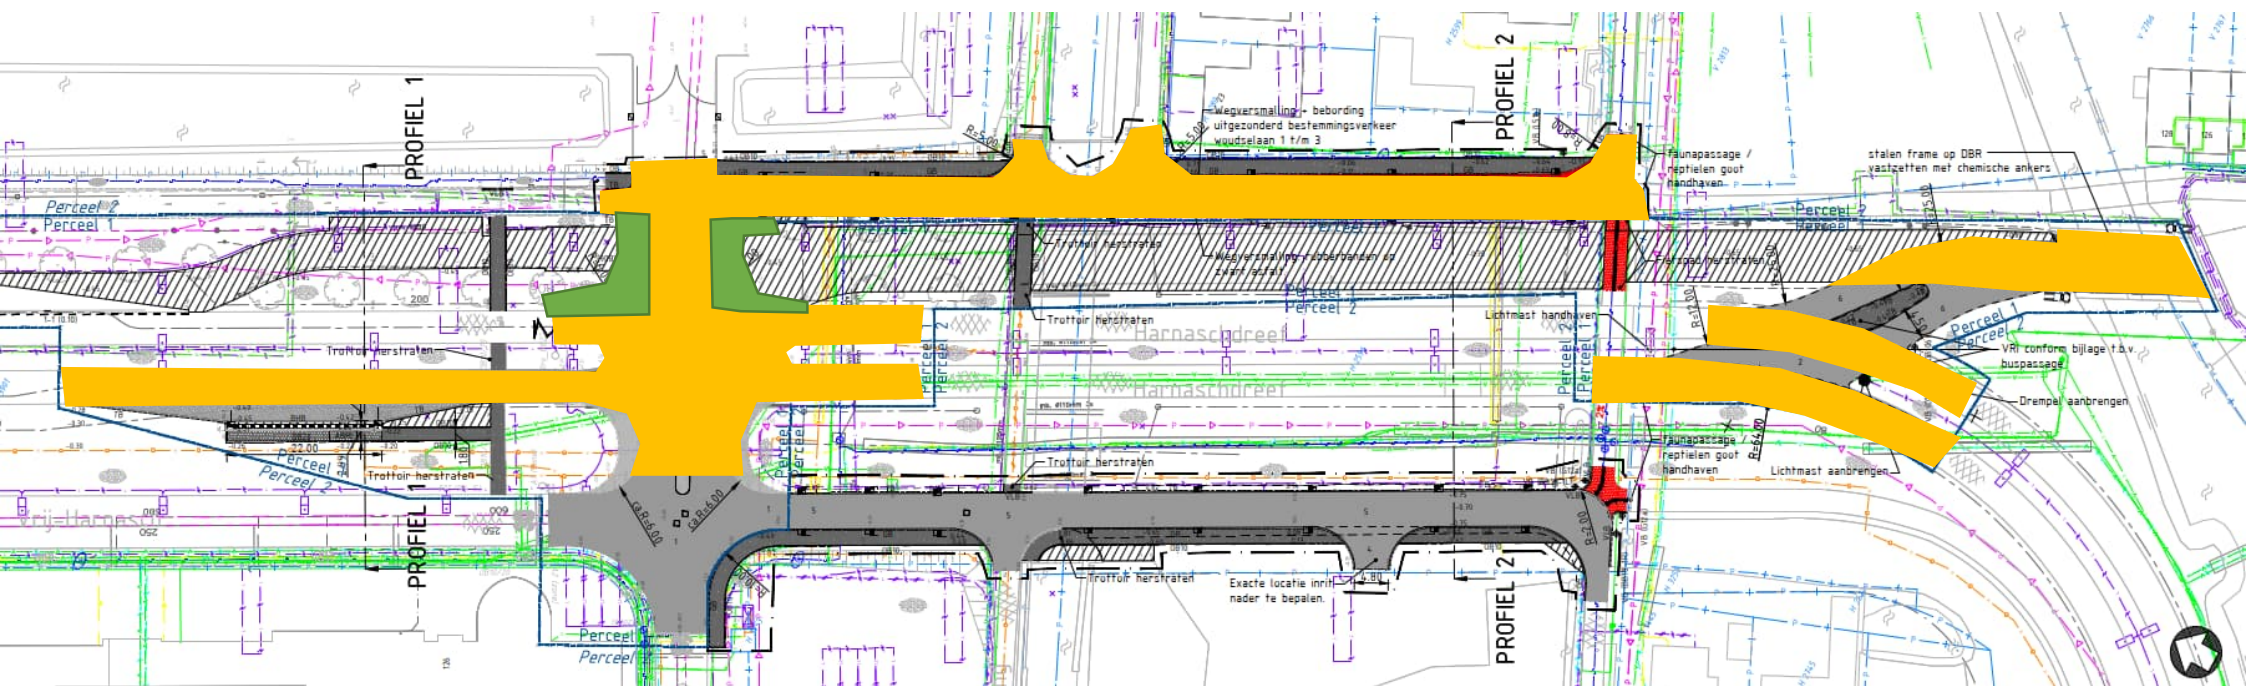


22 april
14:00-17:00
Reinigen werkvak

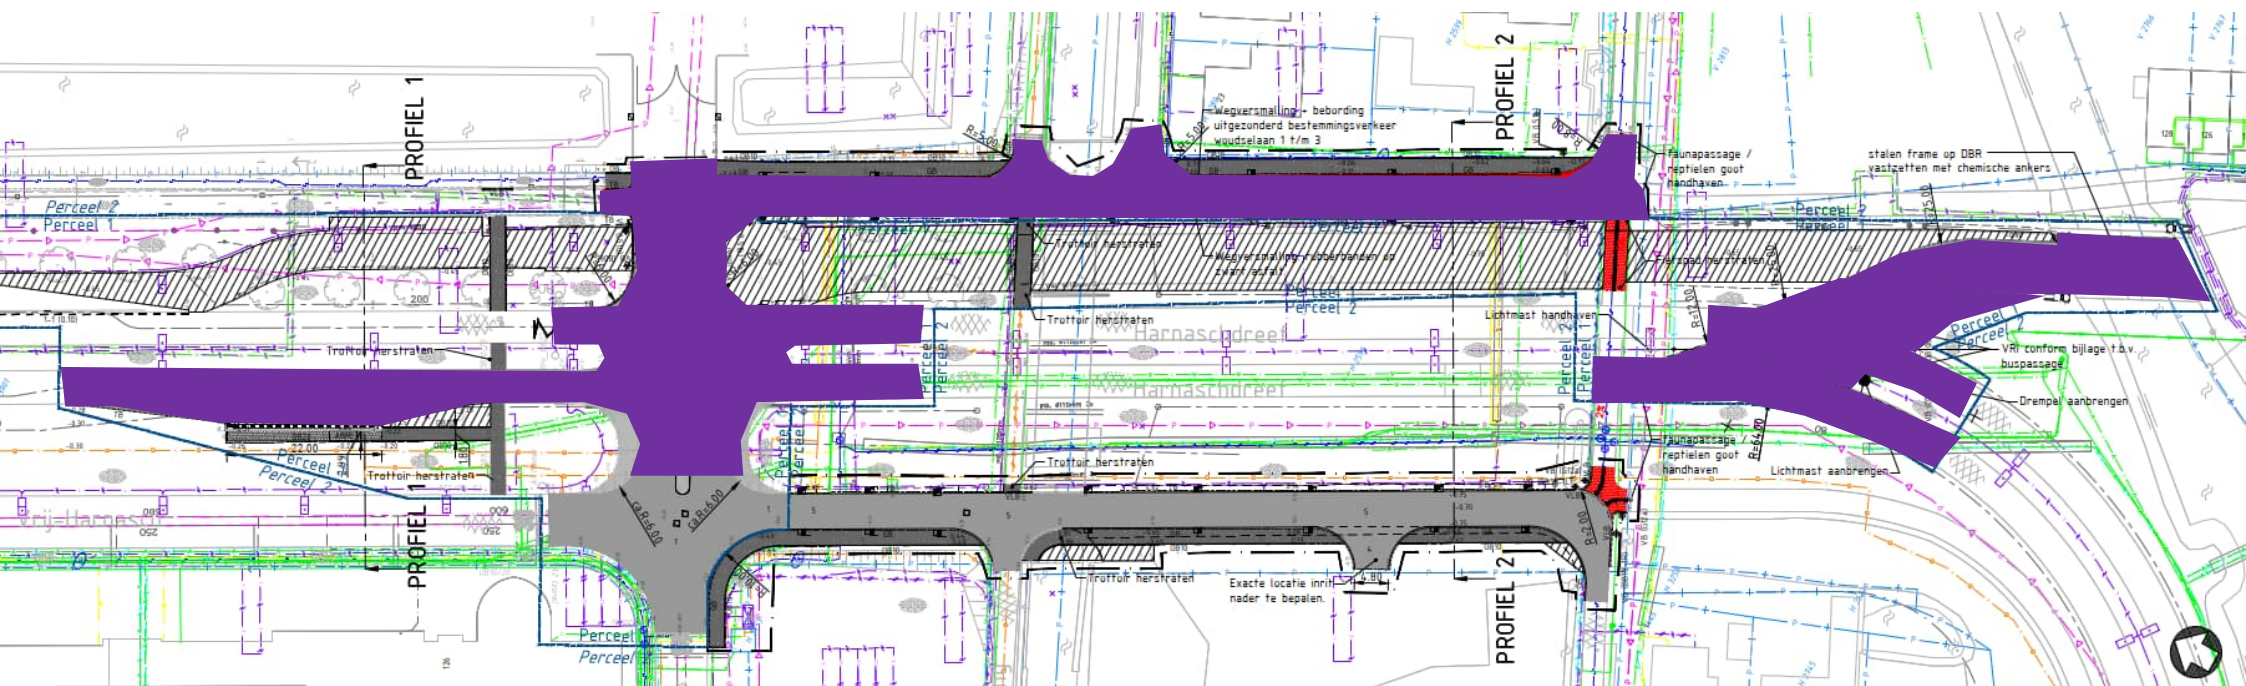


22 april
Avond/nacht


Werkzaamheden HIG
Zagen lussen tussenlaag + klinkerlus aanbrengen
Verwijderen oude masten
Verplaatsen masten
Aansluiten masten

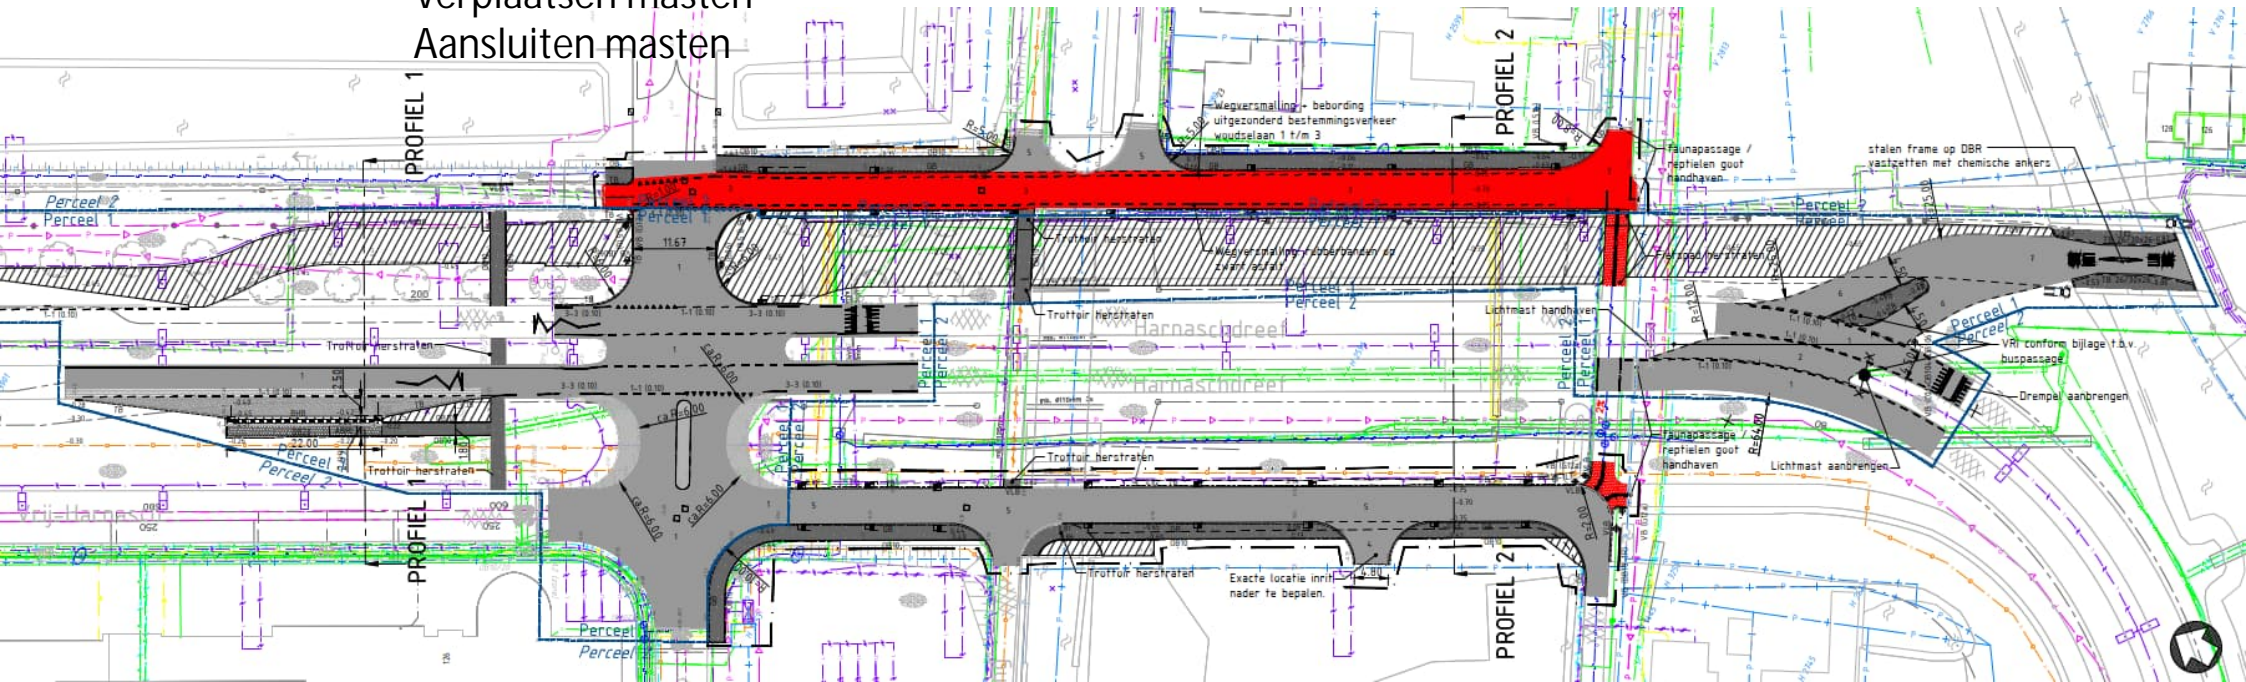


23 april
7:00-09:00
Aanbrengen tussenlagen

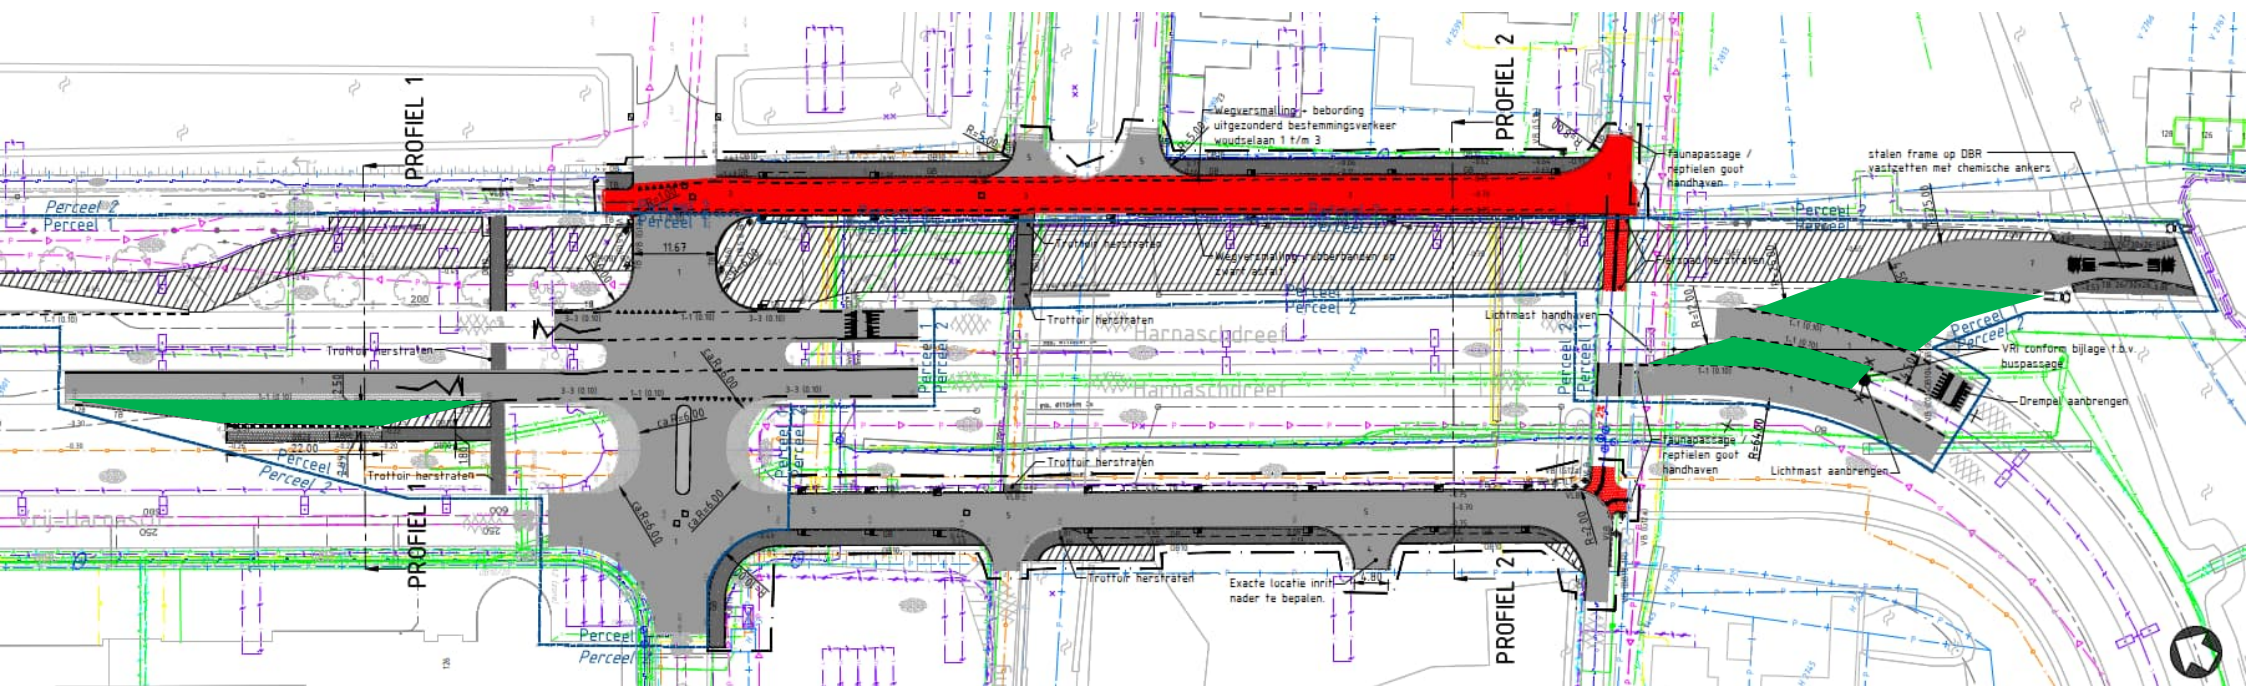


23 april
9:00-10:30
Aanbrengen deklagen doorsteek

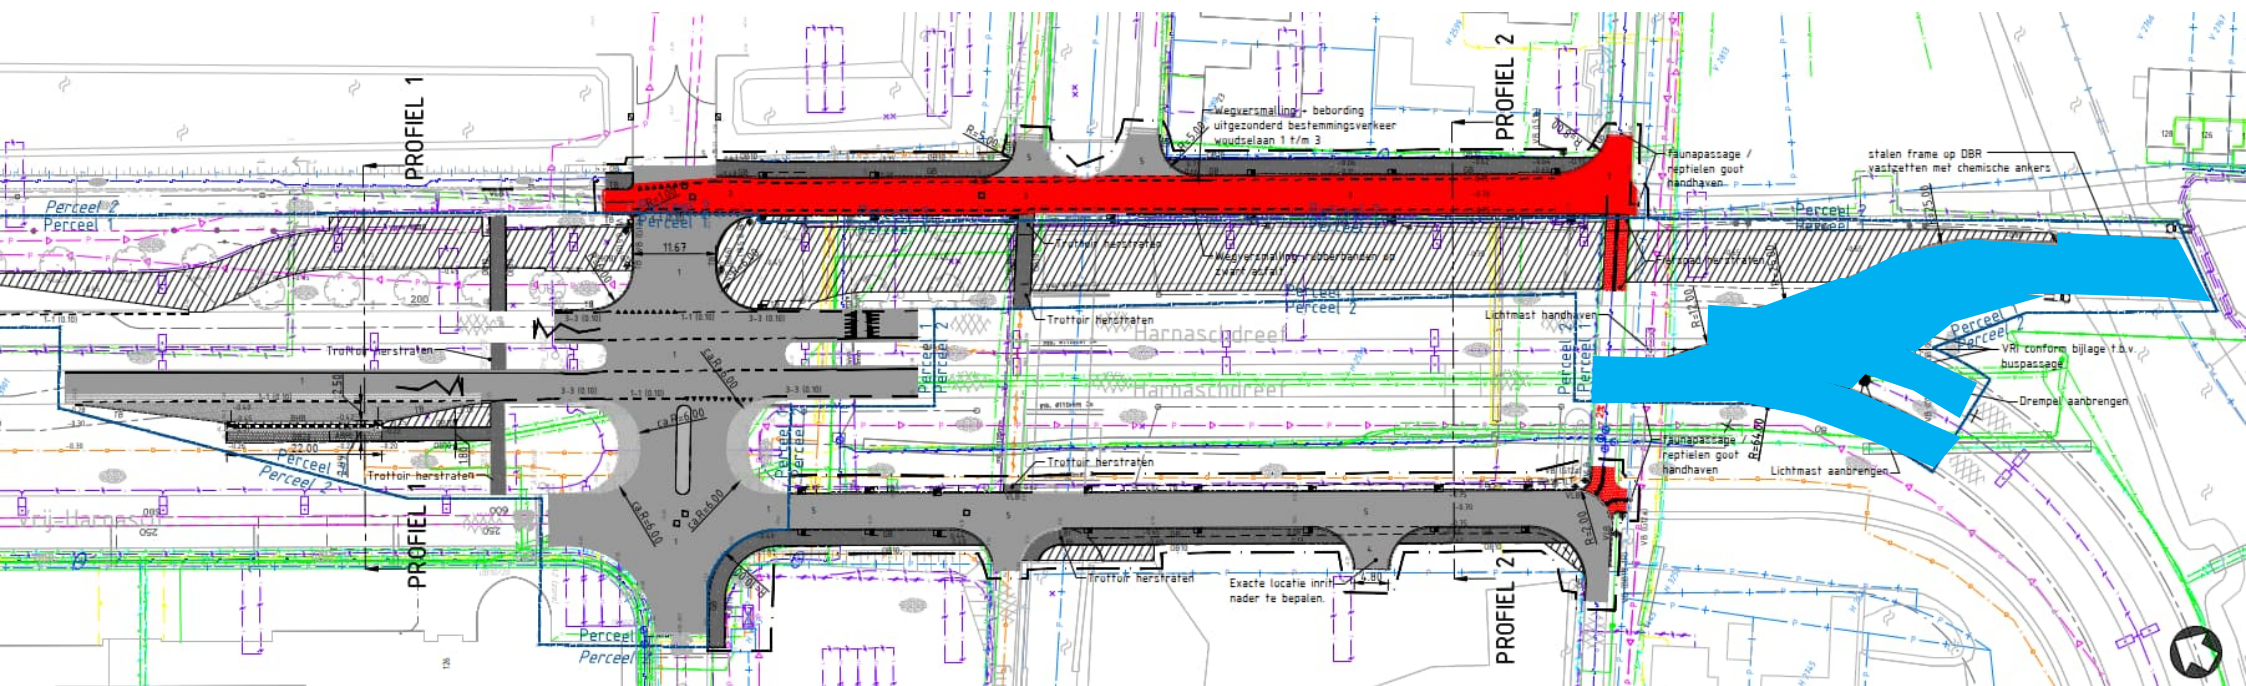


23 april
11:00-14:00
Aanbrengen deklagen kruising
Incl. drempel

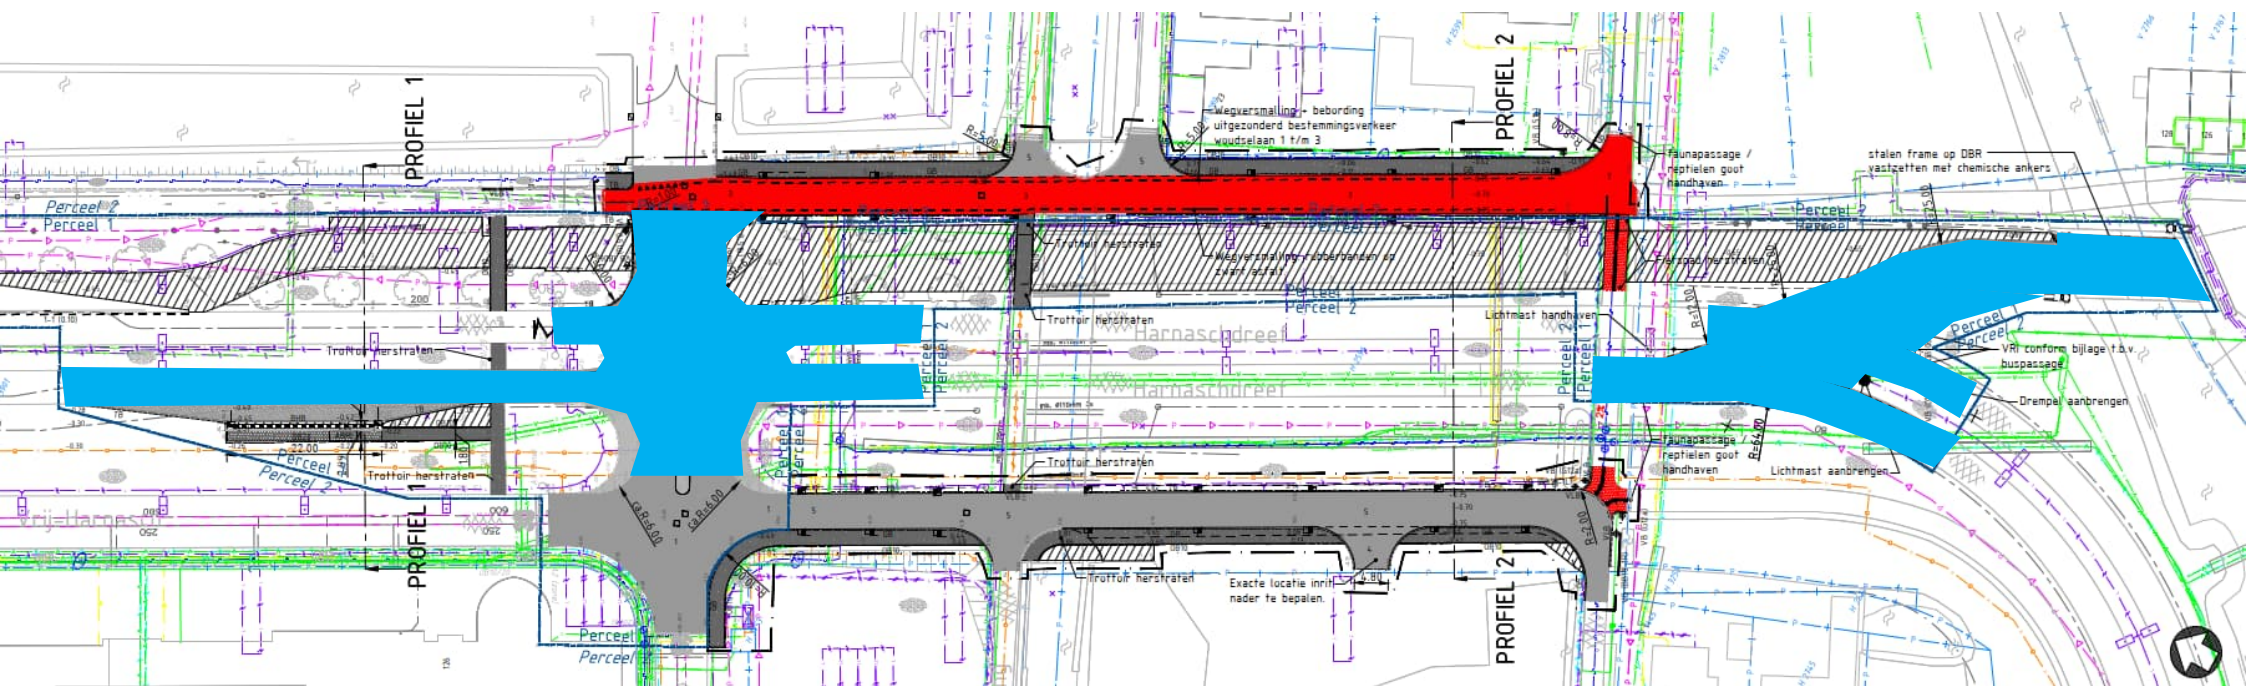


23 april
12:00-16:00
Aanbrengen bussluis

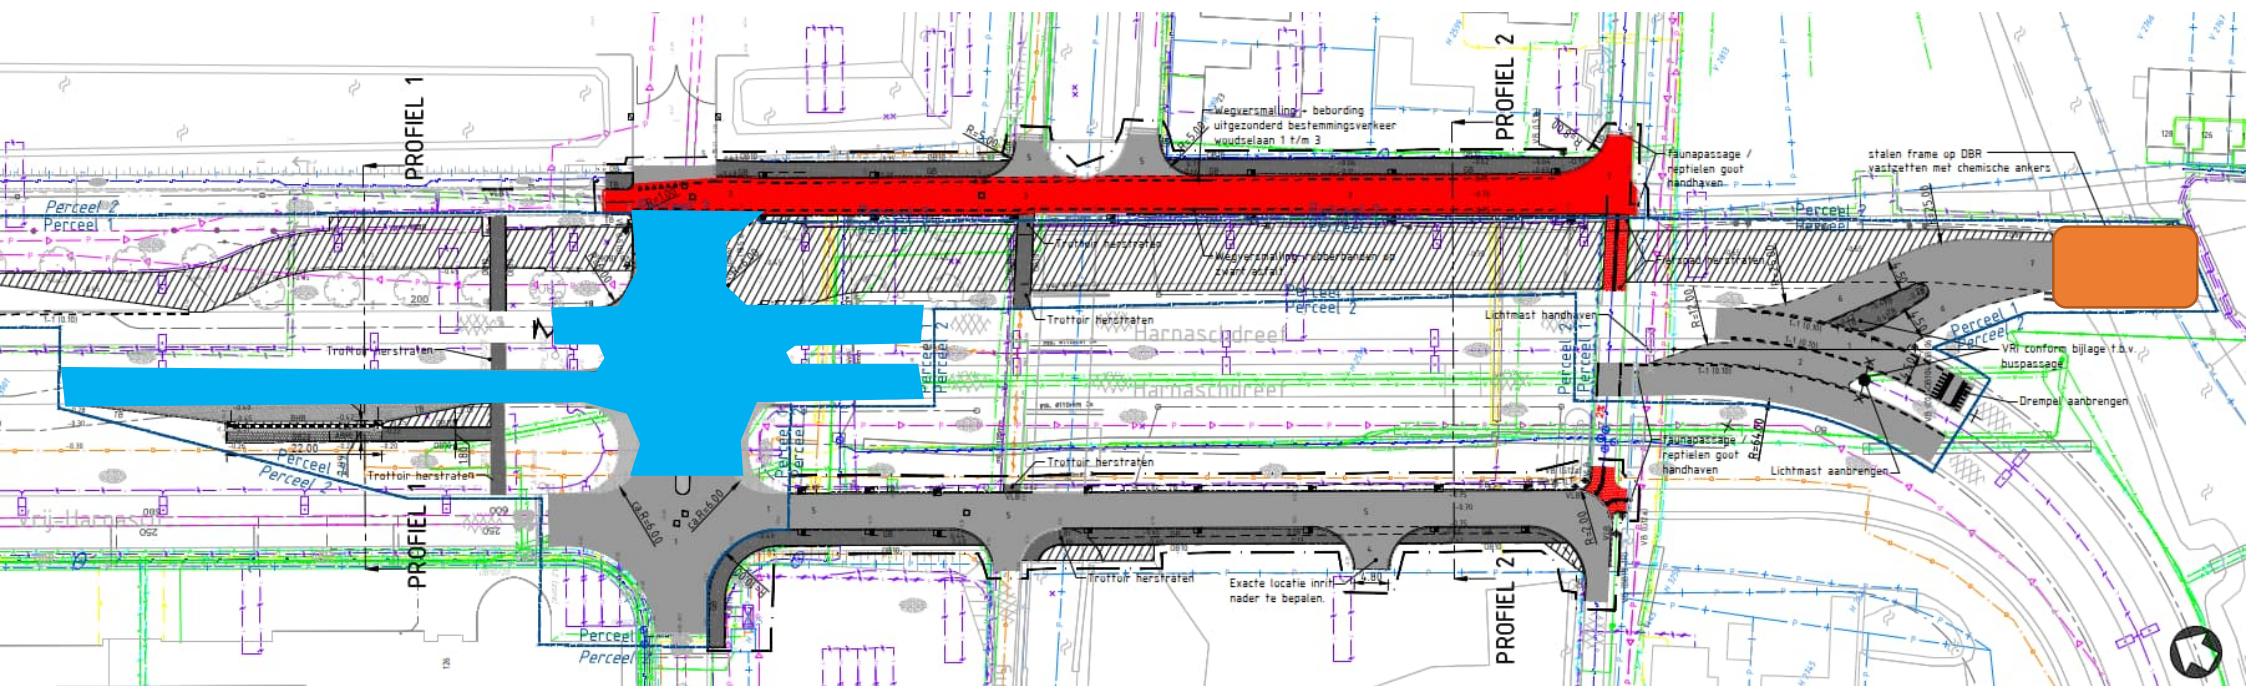

23 april
14:00-15:30
Aanbrengen deklaag fietspad

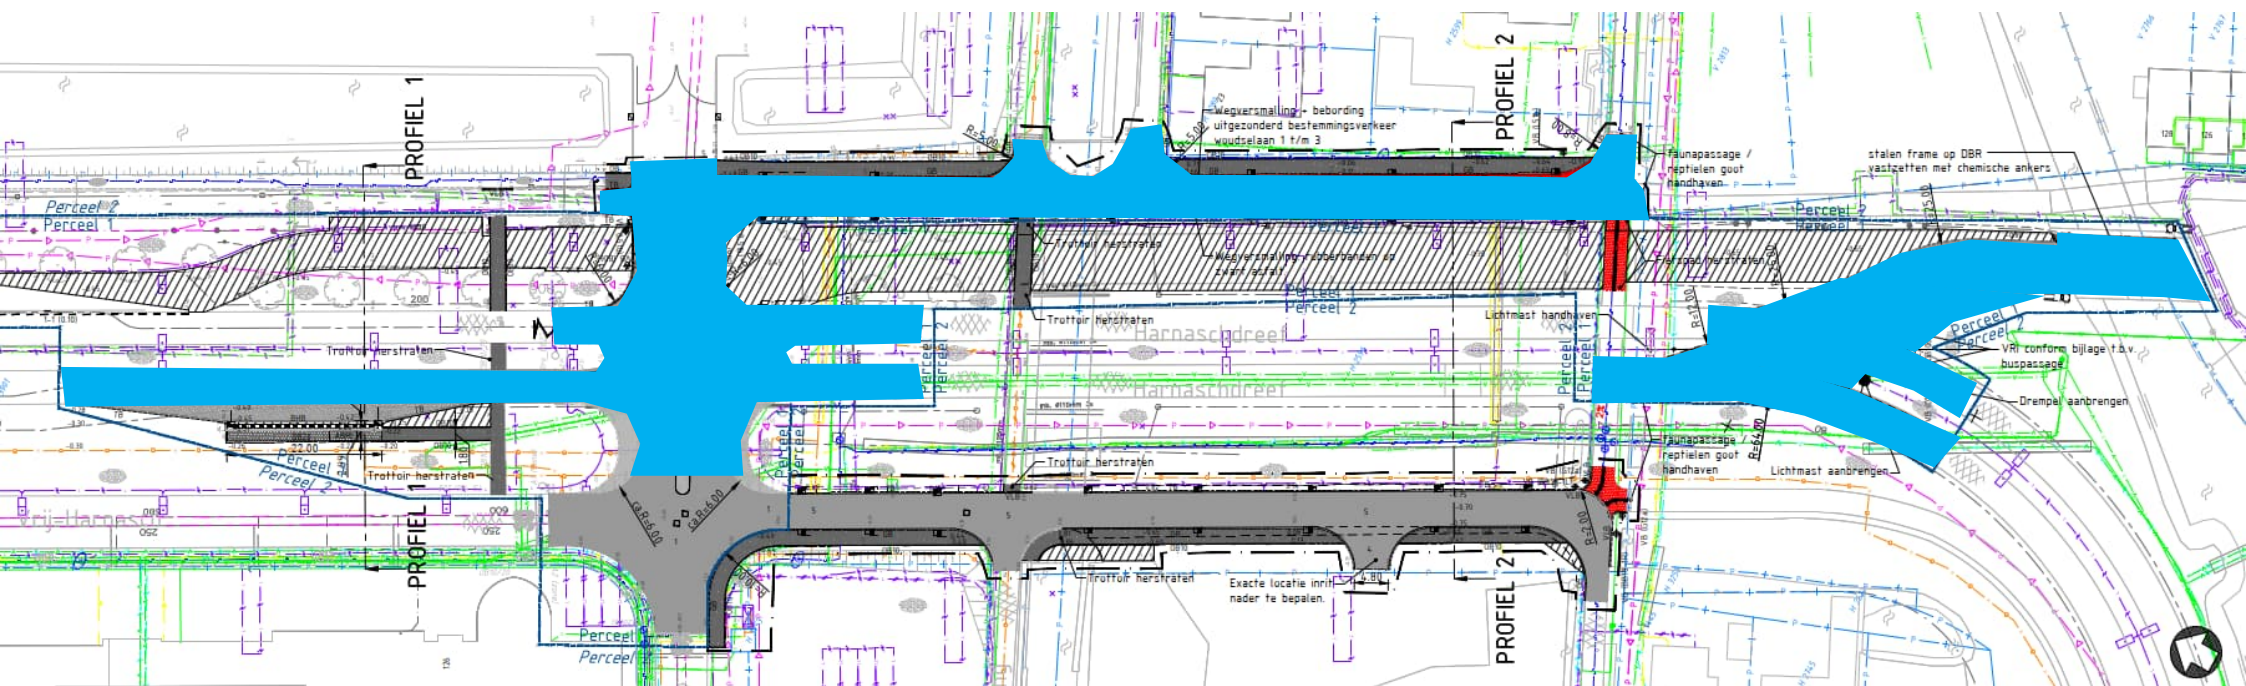

23 april
14:00-18:00
Aanbrengen markering
Aanbrengen lussen in deklaag

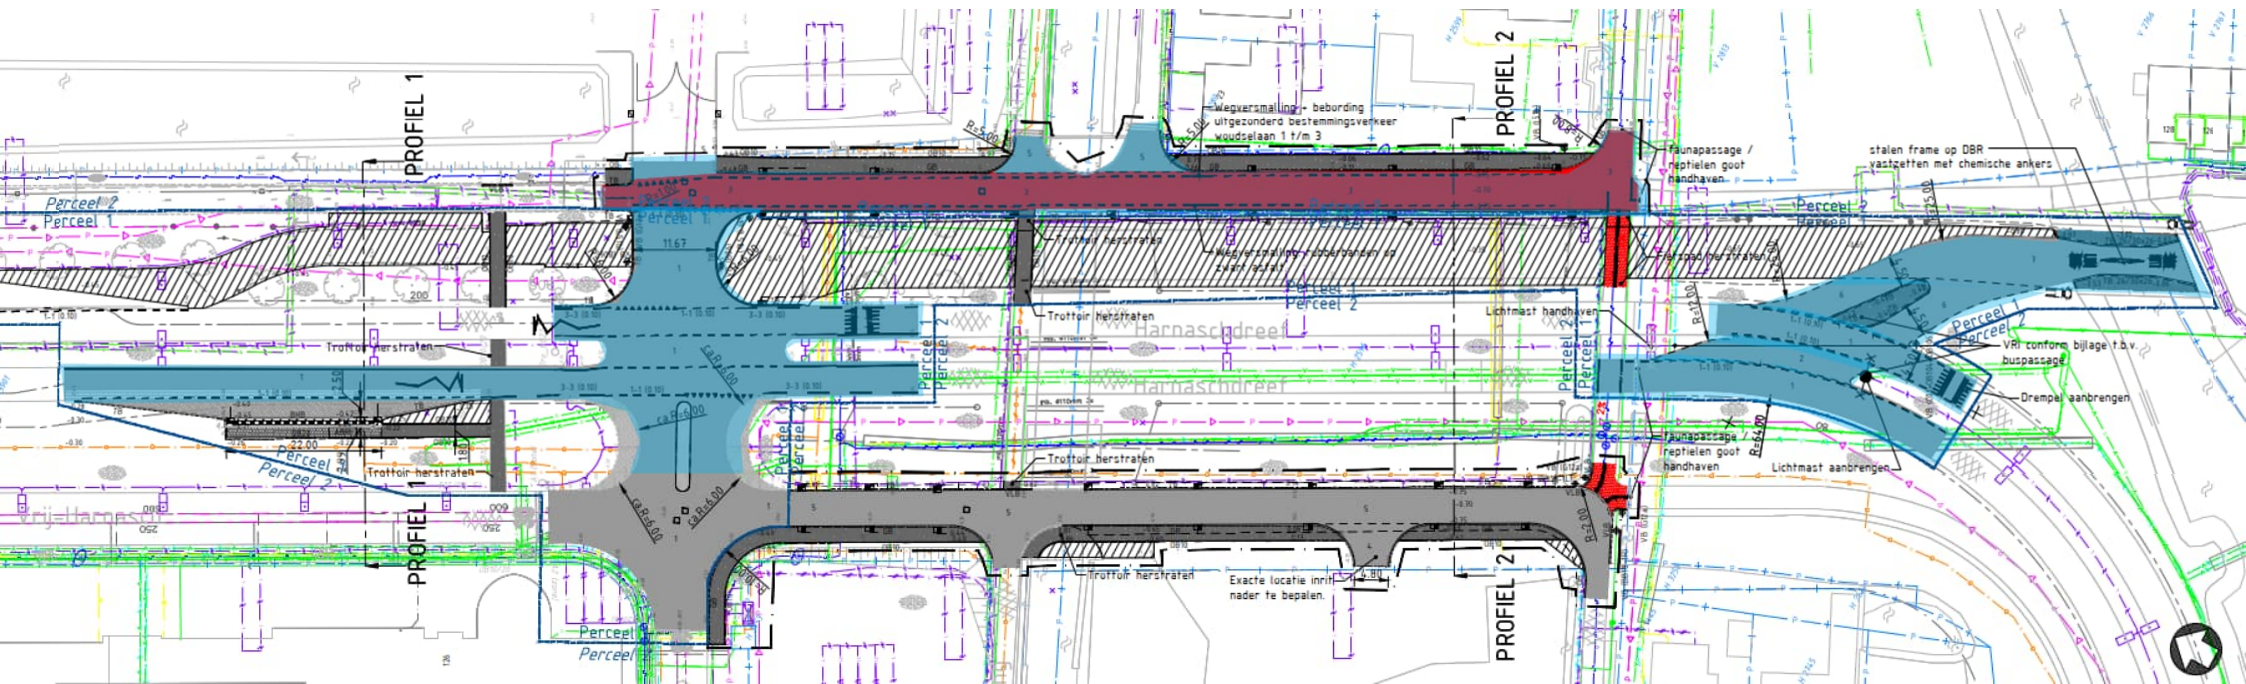

23 april
20:00
Werkvak gereed

